

ANTICIPATORY ACTION FRAMEWORK

BURKINA FASO
Sécheresse



Cadre de l'Action Anticipatoire

Pilote de la Sécheresse au Burkina Faso

Version 2024 | Approuvé par le Coordinateur des Secours d'Urgence (ERC) le 28 février 2024

1. Résumé

L'objectif de ce document est de présenter le cadre d'Action Anticipatoire (AA) contre la sécheresse au Burkina Faso, y compris le déclencheur de prévision (le modèle), les plans d'action préétablis (la livraison) et le financement pré-arrangé (le financement).

L'objectif du projet pilote est d'atténuer l'impact de la sécheresse sur les individus et les communautés vulnérables, et à risque, au Burkina Faso, grâce à une action anticipatoire collective et intersectorielle. Le pilote se concentre sur les régions sujettes à la sécheresse et très vulnérables de la Boucle de Mouhoun, du Centre-Nord, du Sahel, et du Nord. Le projet pilote a le potentiel d'atteindre plus de 800.000 personnes avec un ensemble intégré de soutiens avant le début de la sécheresse.

Le modèle utilise trois déclencheurs basés sur les prévisions et données observationnelles axées sur les précipitations pendant les moments clés de la saison des pluies. Les prévisions utilisées sont générées par l'Institut International de Recherche de l'Université de Columbia, ainsi que des données provenant de NOAA CMORPH¹ (SPI) et de l'outil GeoWRSI² de UCSB (WRSI). Les déclencheurs fonctionnent comme suit :

- **Déclencheur I** : En mars, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne au cours de la période juin, juillet et août, des fonds seront débloqués pour le démarrage des activités par les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence), la protection, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
- **Déclencheur II** : En juillet, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne en août, septembre et octobre, des fonds seront débloqués pour la mise en œuvre d'activités par les secteurs de la sécurité alimentaire et la nutrition.
- **Déclencheur III** (cf. annexe 2) : En août, septembre ou octobre (non-cumulatif), si le seuil de déclenchement pour les déclencheurs observationnels (SPI et/ou WRSI) est atteint (SPI-1 inférieur à -1,5 ou WRSI inférieur à 75), des fonds seront débloqués pour la mise en œuvre d'activités par tous les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence) la nutrition, la protection, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

Bien qu'étroitement liés, chaque déclencheur (I, II et III) est indépendant. En tant que tel, l'action anticipatoire des différents secteurs repose sur le respect du déclencheur respectif, et dans ce contexte, une activation partielle du plan d'action est possible.

La mise en œuvre d'une action anticipatoire est guidée par un plan d'action préapprouvé qui sera mis en œuvre par cinq agences des Nations Unies - la FAO, le HCR, l'UNFPA, l'UNICEF et le PAM - en partenariat avec les ONG, et en étroite coordination avec les autorités locales. Le plan d'action convenu au préalable comprendra les actions suivantes :

- **Atténuer, prévenir et anticiper les risques de protection** parmi les groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les personnes à besoins spécifiques face à la sécheresse prévue grâce à l'amélioration des systèmes et des capacités de surveillance des risques (OSC et acteurs/mécanismes de protection à base communautaire), le renforcement des systèmes de référence, et des services connexes, des messages de sensibilisation, l'accompagnement psychosocial des enfants et familles en détresse, ainsi que la distribution de kits de dignité et/ou toute autre forme d'assistance matérielle avec ou sans la modalité cash (UNICEF, UNFPA et UNHCR).

¹ <https://www.drought.gov/data-maps-tools/global-gridded-standardized-precipitation-index-spi-cmorph-daily>

² <https://www.chc.ucsb.edu/tools/geowrsi>

- **Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance** contre les risques de sécheresse pour les communautés agricoles et pastorales, en mettant l'accent sur les plus vulnérables, à travers la fourniture d'une assistance en espèces (conditionnelle et inconditionnelle), la création d'actifs, la livraison de messages clés, et la fourniture d'intrants et assistance technique aux agriculteurs et éleveurs (FAO et PAM).
- **Atténuer la mortalité** liée à la malnutrition aiguë grâce à un dépistage précoce et à des soins de qualité pour les enfants âgés de 6 à 59 mois (UNICEF).
- **Garantir l'accès à l'eau** pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène (UNICEF).

Le **financement** du cadre provient principalement du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF). L'accord de financement préétabli avec le CERF engage jusqu'à 15 millions de dollars pour une action anticipatoire contre la sécheresse. Le financement ne peut être débloqué que lorsque les déclencheurs respectifs sont atteints.

2. Introduction

Objectifs de l'Action Anticipatoire

Il existe un large accord au sein du secteur humanitaire international sur la nécessité de passer d'une approche largement réactive à une approche anticipatoire. Une approche anticipatoire conduira à une réponse plus efficace, et digne. Elle protège également les gains de développement durement acquis.

Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'occurrence et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques avec une certitude croissante. En tirant parti des différentes approches analytiques, les événements météorologiques inhabituels peuvent non seulement être prédits, mais leurs impacts projetés peuvent être atténués de manière proactive sur la base d'actions anticipatoire pré-identifiées.


Sur la base de preuves croissantes, agir avant l'apparition d'un danger prévisible est nettement plus efficace (coût moindre) que la réponse humanitaire traditionnelle, ce qui a encouragé OCHA à faciliter la mise en place de plusieurs cadres d'action anticipatoire.

Un cadre d'action anticipatoire comprend trois éléments de base, qui sont tous étayés par un plan clair d'apprentissage, de suivi, et d'évaluation :

- Une prévision robuste intégrée dans un processus décisionnel clair (le **modèle**).
- Des plans d'action convenus à l'avance qui peuvent modifier fondamentalement la trajectoire de la crise (la **livraison**).
- Un financement préétabli (le **financement**).

L'action collective anticipatoire reste un espace innovant. En plus des trois éléments de base, OCHA investit également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre, étayés par des plans d'apprentissage, de suivi et d'évaluation clairs.

Comment l'action anticipatoire fonctionne?

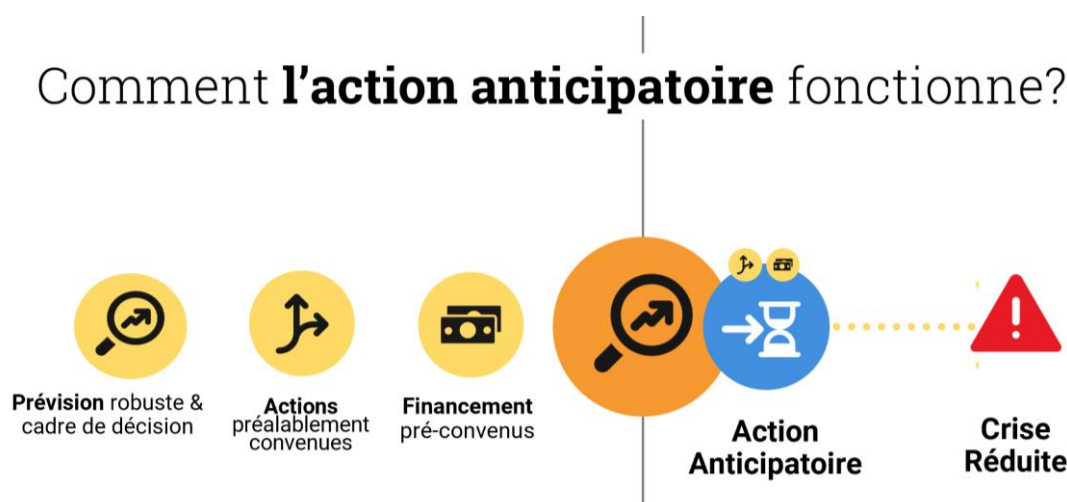

Principe de base

Voici les principes fondamentaux qui orientent le pilote d'action d'anticipation de la sécheresse au Burkina Faso. Ces principes sont intégrés et maintenus dans les différentes composantes et processus du cadre de l'action anticipatoire.



- **Poursuivre une programmation de qualité** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre de l'action anticipatoire sont chargés de poursuivre et de garantir une programmation de qualité conforme au contexte et aux besoins, en particulier, des plus vulnérables.
- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : Les partenaires doivent donner la priorité aux interventions multisectorielles et co-ciblées, lorsque cela est possible, afin de maximiser les synergies et d'obtenir un impact important.
- **Garantir la centralité de la protection** : Conformément à la politique de centralité de la protection de l'IASC et au principe de « ne laisser personne de côté » (Agenda 2030), tous les partenaires mettant en œuvre des interventions anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggraverait pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion, et d'exploitation. Les actions anticipatoires doivent également garantir qu'elles bénéficient à toutes les communautés (communautés locales, communautés déplacées, rapatriés et réfugiés) en fonction de leurs besoins, tout en tenant compte des obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap, ou à l'appartenance sociale. La protection étant au centre de toute réponse humanitaire, dans la pratique, elle suppose des activités visant à garantir le plein respect des droits des personnes, dans le respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l'homme. En d'autres termes, la réponse humanitaire améliore l'accès à ces droits, que ce soit au début d'une situation d'urgence, dans des situations prolongées ou lors de la recherche de solutions. Les considérations relatives à la protection imprègnent les actions humanitaires en faveur des réfugiés et d'autres personnes ayant besoin de la protection internationale, des apatrides et des déplacés internes. Elles doivent commencer avec le renforcement des cadres juridiques grâce auxquels leurs droits sont garantis, sans toutefois s'y limiter.
- **Promouvoir la redevabilité envers les populations affectées** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre de l'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des approches de redevabilité de leurs activités envers les populations affectées. Cela inclut tous les efforts pour solliciter, entendre, et agir sur les voix et les priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et victime ou à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action d'anticipation. Cela signifie également s'assurer que les commentaires de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions anticipatoires.
- **Soutenir la localisation** : Tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre doivent honorer l'engagement de L'Equipe Humanitaire Pays (EHP) envers la localisation. Des partenariats équitables avec les acteurs locaux s'appuyant sur leurs relations à long terme et la confiance avec les communautés lors de l'action anticipatoire sont cruciaux.
- **S'engager dans des partenariats** : La collaboration entre les acteurs humanitaires est essentielle pour garantir l'engagement de tous les secteurs, et que l'aide soit mobilisée conformément au cadre des AA.
- **Utilisation d'espèces lorsque cela est possible** : La communauté humanitaire encourage l'utilisation d'espèces comme modalité d'assistance par défaut lorsque les marchés et les contextes opérationnels le permettent, afin de promouvoir la dignité et renforcer la résilience des populations affectées.
- **Générer des co-bénéfices pour le développement** : Les participants au projet pilote sont encouragés à examiner comment le financement d'une action anticipatoire peut compléter le financement du développement en réduisant les souffrances et en s'attaquant aux causes profondes des problèmes. Par exemple, si le plan d'action anticipatoire convenu à l'avance inclut la réparation des forages, les agences de mise en œuvre doivent s'assurer que la qualité des réparations durera au-delà de la crise humanitaire immédiate.
- **Capter l'apprentissage** : Les activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage doivent être intégrées à chaque phase du développement et de la mise en œuvre du cadre de l'AA.

- **Viser l'intégration** : Le cadre cherche à intégrer les activités de l'action anticipatoire dans l'architecture humanitaire existante et à favoriser les liens avec la programmation à long terme, y compris les initiatives de résilience et de développement.

Sécheresse au Burkina Faso

Exposition

Le climat du Burkina Faso est caractérisé comme un climat tropical sec. Le pays a trois zones climatiques distinctes, dont la zone du nord « sahélienne », la zone du centre « soudano-sahélienne », et la zone sud « soudanienne », qui divisent globalement le pays en trois bandes horizontales. Les précipitations moyennes sont les plus faibles dans la zone sahélienne (600 mm de moyenne annuelle), suivie de la zone nord-soudanienne (600-900 mm de moyenne annuelle), puis de la zone sud-soudanienne (900+ mm de moyenne annuelle). Les précipitations observées au 20^{ème} siècle ont montré une tendance à la baisse des précipitations annuelles totales sur l'ensemble du pays et du nombre de jours de pluie, ainsi qu'une tendance à la hausse du nombre de jours secs consécutifs (de 46 à 57 jours par décennie). De plus, l'analyse montre une plus grande variabilité saisonnière et interannuelle. Les projections des modèles climatiques indiquent que ces tendances négatives se poursuivront. Sur la base de ces éléments, le climat futur devrait être caractérisé par un réchauffement continu, une forte variabilité des précipitations, et la survenue d'événements météorologiques et climatiques extrêmes, en particulier, la sécheresse.

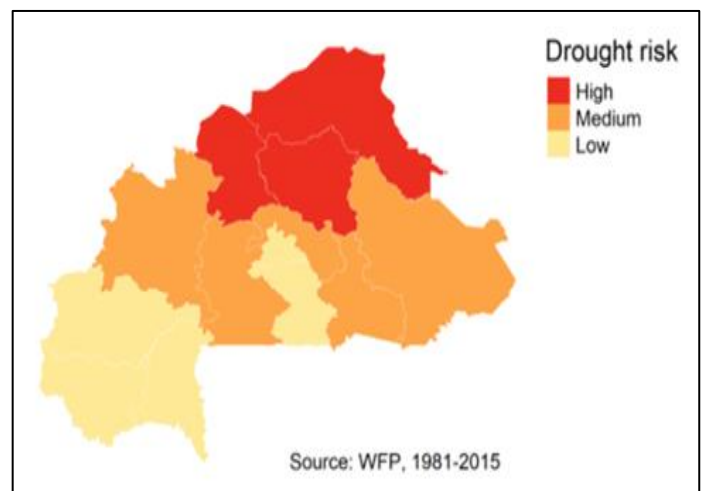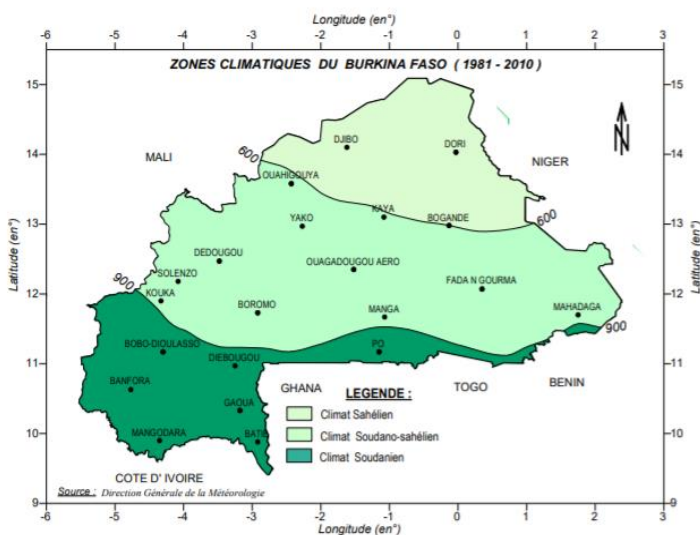


Vulnérabilité

Si l'exposition à la sécheresse est élevée, la vulnérabilité l'est aussi. La vulnérabilité découle en grande partie de la dépendance à l'égard des précipitations. L'économie du pays dépend fortement des précipitations pour presque tous ses besoins en eau, y compris l'agriculture. L'agriculture contribue à un tiers du PIB du pays, soit 80% des moyens de subsistance de la population. Les capacités d'adaptation sont limitées, avec près de la moitié de la population (46 %) vivant en dessous du seuil de pauvreté, n'ayant pas les moyens de gérer les risques et de résister aux chocs. Les capacités institutionnelles ont également été érodées, à la suite d'événements de chocs récurrents et des réponses humanitaires associées. Au cours de la période 1969 à 2014, les sécheresses ont touché un nombre cumulé de 12,4 millions de personnes.

La vulnérabilité découle également des conflits. Le conflit armé a commencé en 2015 et s'est aggravé depuis 2018. En 2020, en raison de la violence et des déplacements subis, le Burkina Faso est devenu l'une des crises humanitaires les plus importantes et les plus rapides au monde ; en 2023, cette crise a été évaluée comme étant la plus négligée au monde³. Beaucoup ont perdu l'accès aux ressources et aux moyens de subsistance, délimitant leurs options de gestion des risques pour résister à un choc. Particulièrement, le mode opératoire des groupes armés, ainsi que les interventions militaires du

³ <https://www.nrc.no/news/2023/june/burkina-faso-is-the-worlds-most-neglected-crisis/>

Gouvernement de Transition, empêchent des millions de personnes de se déplacer librement dans le pays, et par la même occasion, limitent sérieusement l'accès pour les acteurs humanitaires, et donc de garantir une assistance efficace. Ceci exacerbe la vulnérabilité des populations déjà sérieusement touchées par la crise, et a un impact considérable sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque.

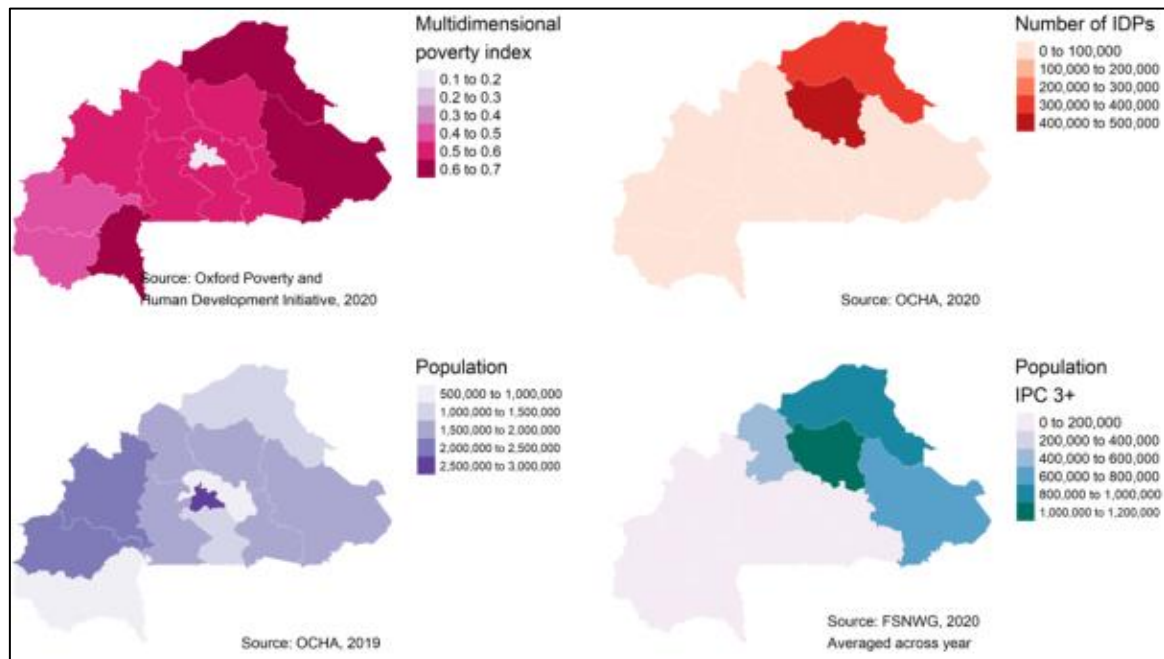


Impact humanitaire

Depuis le début des années 1970, le Burkina Faso est touché par des sécheresses récurrentes. Au cours de la période 1969 à 2014, les sécheresses ont touché un nombre cumulé de 12,4 millions de personnes. Cela fait de la sécheresse le principal moteur des besoins humanitaires avant la survenue de la crise sécuritaire. Au cours de cette période, les impacts de la sécheresse ont été notés comme étant les plus graves en 1980, 1990, 2011 et 2014. Ces dernières années, les observations montrent que l'impact de la sécheresse est devenu plus fréquent et plus répandu. Les impacts couramment cités de la sécheresse incluent l'épuisement de l'eau et d'autres ressources naturelles, la réduction des rendements des cultures, la réduction de la qualité et de la quantité du bétail, une incidence plus élevée de malnutrition et de maladie, ainsi que des marchés et des mécanismes financiers déstabilisés.



En phase courante du Cadre Harmonisé (CH) (octobre, novembre, décembre 2021), 5 provinces sur 16 qui comptent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Nord et du Sahel étaient déjà en phase de crise (Ph3) et 6 provinces en phase sous pression (PH2). Si rien n'est fait d'ici juin 2022, 10 de ces 16 provinces se retrouveront en phase de crise à pire (ph3+) dont 3 provinces en urgence avec une population en insécurité alimentaire qui avoisinerait 1 720 000 personnes (soit 65% de l'effectif national des personnes en phase 3+). En outre, 9 provinces ont un accès limité à cause de l'insécurité.

La combinaison de besoins humanitaires chroniques et aigus fait en sorte que tout événement futur de sécheresse peut créer une grande force de déstabilisation, entraînant des conditions de crise.

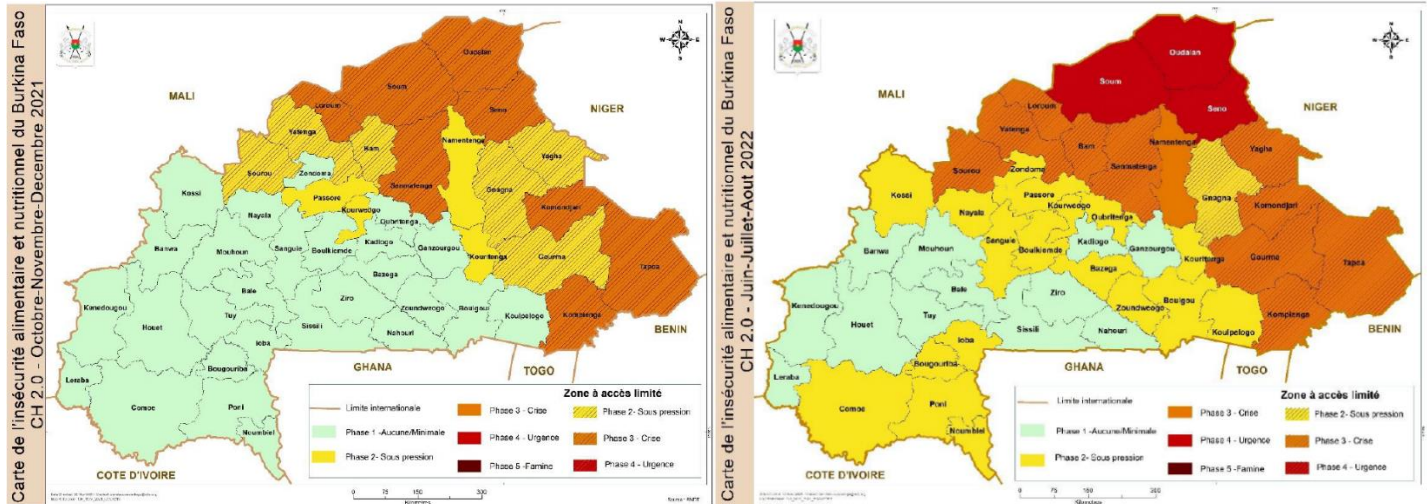

Orientation Géographique


L'analyse historique indique que les épisodes de sécheresse suivent la division de la zone climatique dans le pays. Le nord du pays est le plus touché, suivi de la région centrale et enfin de la région sud. En particulier, les endroits touchés par la sécheresse sont également des zones avec une pauvreté multidimensionnelle prononcée, un nombre très important de personnes déplacées internes, et des personnes affectées par des besoins humanitaires aigus. En tant que telles, les régions ciblées sélectionnées et convenues avec l'équipe humanitaire de pays comprennent la Boucle de Mouhoun, le Centre Nord, le Sahel et le Nord. Cela chevauche les régions prioritaires identifiées par le Plan de réponse humanitaire du Burkina et où l'ONU a accordé la priorité à l'aide humanitaire.

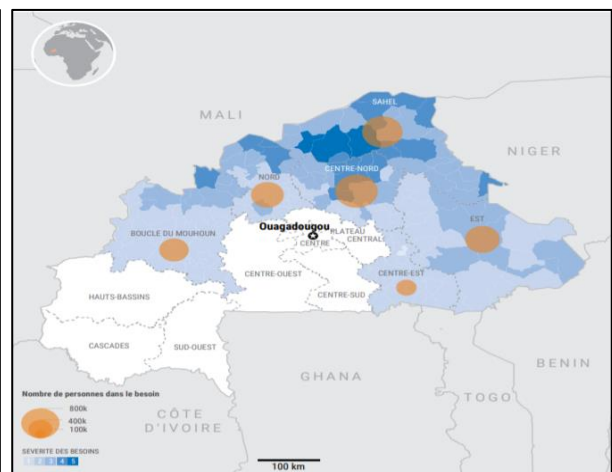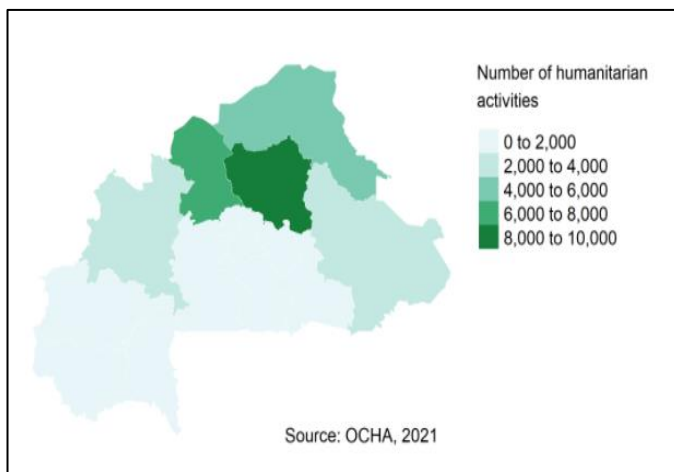

Chronologie de la crise

Le Burkina Faso a une seule saison des pluies. La saison des pluies s'étend de mai à octobre. Les préparatifs du terrain commencent généralement vers le mois de mars. Les semis peuvent avoir lieu dès mai et juin. Le mois de juillet est décisif dans le calendrier culturel au Burkina Faso car il correspond au dernier mois de la fenêtre des semis. Ainsi, un déficit hydrique pendant cette période affecterait négativement la production agricole et pastorale. Une action anticipatoire pendant cette période permettrait de minimiser l'impact de la sécheresse en développant des activités de productions à cycle court (maraîchage, fourrages, tubercules, etc.) pour renforcer la résilience des populations et aussi améliorer la disponibilité alimentaire. Pendant le mois d'août, étant le mois le plus pluvieux, un déficit pluviométrique entrainerait un tarissement précoce des plans d'eau conduisant à un déficit hydrique précoce qui, à son tour, affecterait négativement tous les secteurs d'activités, notamment avec l'apparition des maladies hydriques. La période de soudure maximale commence en juin et

ture jusqu'en septembre en année normale. Alors que les cultures hâtives peuvent être récoltées en septembre. La récolte principale est généralement faite en novembre et décembre. La période sèche dure de novembre à avril.

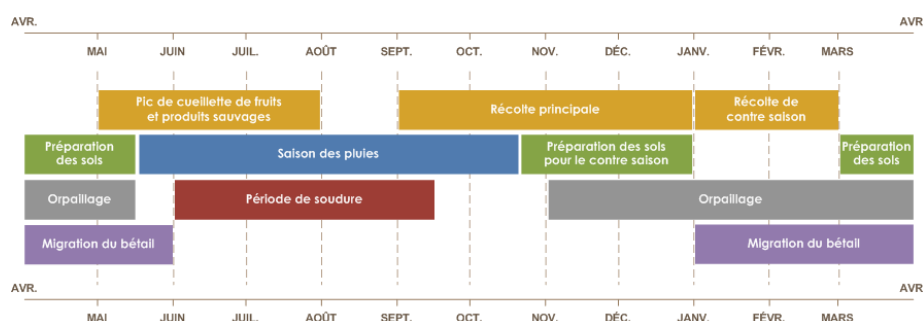

Calendrier saisonnier (source : FEWSNET)

Sur la base du calendrier saisonnier et des commentaires des partenaires, la période de juin, juillet, août et septembre est critique, fournissant jusqu'à 90% des cumuls pluviométriques annuels. Si les niveaux de précipitations suffisants ne sont pas atteints à ce moment, la saison est considérablement compromise. De plus, si la fin de la saison est également mauvaise, les impacts cumulatifs des faibles précipitations pendant cette période peuvent accélérer le début de la période de soudure et la prolonger, et d'autres besoins humanitaires peuvent commencer à se manifester.

En plus, le renouvellement des ressources en eau du pays est également dépendant de la pluviométrie et des nombreux points d'eau utilisés pour la consommation humaine et animale sont saisonniers. Pendant la saison des pluies, les ressources en eau souterraines superficielles se renouvellent par infiltration et les retenues d'eau superficielles (bolis, barrages) utilisés pour la production et distribution d'eau se remplissent. Pendant la période sèche, les ressources en eau diminuent jusqu'à atteindre leur niveau plus bas en mars-avril-mai ce qui correspond aussi à la période de plus grande chaleur et évaporation. Des nombreux points d'eau s'assèchent ou réduisent leur productivité. Ainsi, les besoins en eau sont les plus critiques en mars-avril-mai avec des risques de stress hydrique et tous les risques de protection associés aux conflits et tensions autour des rares points d'eau.

Dans ce contexte, trois moments clés du besoin humanitaire ont été identifiés par les partenaires pour orienter l'action anticipatoire. Ces moments, également appelés fenêtres d'opportunité, sont les suivants :

Fenêtre d'opportunité	Focus	Objectif	Durée de l'Action Anticipatoire
1	juin, juillet, août	Anticiper les impacts des précipitations inférieures à la moyenne pendant la période de mois de juin, juillet et août [saison des pluies de pointe] en déclenchant des actions dès le mois de mars.	Mars – démarrage décembre – fin
2	août, septembre, octobre	Anticiper les impacts des précipitations inférieures à la moyenne en août, septembre, et octobre [fin de saison] en déclenchant des actions dès le mois de juillet.	Juillet – démarrage en avril – fin
3	juillet, août, septembre	Assurer que les mesures anticipatoires puissent être mise en œuvre si les conditions de sécheresse sévères devaient survenir, malgré des prévisions pluviométriques indiquant une période au-dessus de la normal entre juin et octobre.	Août ou septembre ou octobre – démarrage pour 9 mois

Le calendrier de crise en dessous démontre le caractère progressif et multisectoriel de l'aléa sécheresse car les impacts se suivent et se manifestent sur une durée de temps prolongé, dépendamment du secteur concerné. Pour chaque type d'impact, le passage d'une couleur plus clair au foncé indique l'atteinte des conséquences humanitaires difficilement réversibles. Ce qui veut dire que l'action d'anticipation doit avoir lieu sur le terrain avant ce changement.

Comme on peut voir, la sécheresse pourrait d'abord avoir des conséquences sur les principaux actifs de la population (production agricole, pastorale) ainsi que la recrudescence de certaines maladies humaines. Pour ensuite donner lieu à plusieurs conséquences socio-économiques et multisectorielles, fortement liées aux stratégies d'adaptation des ménages frappés par la sécheresse.

De façon synthétique, les principales conséquences pourraient être :

- **Production agricole** : l'impact sur les cultures se réalisera pendant des délais de temps différents dépendant du calendrier agricole et la typologie des cultures. Celles à être impactée immédiatement et de façon plus irréversible seraient les cultures pluviales, suivi par la production maraichère et de contre-saison.
- **Élevage** : la faible régénération des pâturages et la disponibilité des ressources hydriques peut avoir plusieurs conséquences. La soudure pastorale, au lieu de commencer en avril, pourrait s'anticiper aux mois de février ou mars, dépendant de l'envergure de la sécheresse. Cela impliquerait le besoin de fournir de l'assistance en intrants et soins vétérinaires avant cette période. La détérioration de la situation pastorale entraîne une perte de l'embonpoint des animaux et des mortalités massives du cheptel avec un risque élevé de trouble psychologique pour les pasteurs.
- **Sécurité alimentaire et nutrition** : la chute de la production agropastorale et des revenus peut déterminer une anticipation et prolongation de la soudure humaine l'année suivante à une année de sécheresse. Comme démontré dans le calendrier, au lieu de commencer en juin, la soudure humaine pourrait par contre avoir lieu déjà à partir de mars, nécessitant donc la mise en place d'actions préventives plus tôt que prévu ;
- **Conséquences humanitaires** : plusieurs conséquences multisectorielles pourraient avoir lieu, liées à la chute des revenus et l'érosion des moyens d'existence, comme par exemple l'exode rural, les risques accrus de protection pour les couches vulnérables et l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Par exemple, la déscolarisation des enfants à cause de la transhumance et du faible revenu des parents, les déplacements, la vente des actifs productifs pour un déplacement anticipé vers une nouvelle zone sans abris, l'exposition des femmes et des filles aux risques de protection (VBG, animaux sauvage, banditisme etc.) liés soit au besoin de parcourir des distances plus grandes pour s'approvisionner en eau et bois de chauffe, mais aussi à des potentiels risques majeurs de pratiques d'adaptation négatives tels que la prostitution pour accéder à des revenus ;
- **La recrudescence de certaines maladies humaines**, liées soit à une augmentation due aux mauvaises conditions d'hygiène relatives à la sécheresse mais aussi à une plus faible accessibilité des soins de santé, à cause de la chute de revenus et une détérioration des conditions de santé générale de la population (sous-alimentation et malnutrition).

Le calendrier de la crise démontre clairement que, dépendamment du type d'impact et des actions à entreprendre, la mise en œuvre des actions d'anticipation pourrait démarrer avant le début de la saison de pluie pour terminer au plus tard en avril de l'année suivante, afin d'anticiper les impacts qui se produiraient plus tard.

Burkina Faso – Calendrier de la crise sécheresse																								
	Année 1												Année 2											
Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Climat	H					Saison de pluie					Saison sèche						Saison de pluie							
Risque (Sécheresse)																								
Impact Humanitaire																								
Agricole : Cultures pluviales et fourragères (croissance plus faible et faible récolte)																								
Agricole : Cultures maraichères																								

3.Prévision et déclencheur

Bien qu'étroitement liés, chaque déclencheur (I, II et III) est indépendant. En tant que tel, l'action anticipatoire des différents secteurs repose sur le respect du déclencheur respectif, et dans ce contexte, une activation partielle du plan d'action est possible.

Prévisions

Les prévisions à utiliser sont les prévisions saisonnières publiées par l'International Research Institute at Columbia University (IRI) à la mi-mars (pour la période juin-août) et à la mi-juillet (pour la période août-octobre). Voir : <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/>. Pour les déclencheurs observationnels (déclencheur III), la collecte des données provenant de NOAA CMORPH⁶ (SPI) et de l'outil GeoWRSI⁷ de UCSB (WRSI), surveillées et analysées par le Centre des Données Humanitaires (CDH).

Déclencheurs et seuils

Le seuil d'activation (ou déclencheur) est comme suit :

1. 40%, ou plus, de probabilité de précipitations inférieures à la moyenne, ET
2. La probabilité de précipitations inférieures à la moyenne devrait être supérieure de 5 pourcents à celle de précipitations supérieures à la moyenne.
3. Pour le SPI-1, le seuil sera atteint si la valeur de SPI-1 inférieure à -1,5 sur au moins 30% de la zone ; et pour le WRSI, le seuil sera atteint si la valeur est inférieure à une valeur de 75 sur au moins 30% de la zone. L'un ou l'autre de ces critères peut indépendamment déclencher une activation du cadre.

Enfin, l'activation est également conditionnée à au moins 10 % de la zone (Boucle de Mouhoun, Centre-Nord, Sahel et Nord) répondant à ces critères. Ce critère vise à capter par la diffusion géographique un choc plus sévère, en phase avec les objectifs humanitaires du pilote. Dans l'ensemble, ce cadre vise à cibler 1 type de même⁴.

Rôles et responsabilités dans la surveillance du déclencheur

Les trois déclencheurs seront surveillés par le Centre de données humanitaires (CHD) d'OCHA. Une fois le déclencheur atteint, soit en mars, en juillet, ou les deux, le CHD alertera l'équipe pilote par e-mail. Les moments clés de suivi incluent la mi-mars (pour la période juin-août) et la mi-juillet (pour la période août-octobre).

Protocole d'activation

La prédéfinition d'un protocole d'activation est essentielle pour éviter les retards lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint. Le protocole d'activation décrit les étapes spécifiques à suivre dès que l'un des déclencheurs est atteint.

Dès que le déclencheur est atteint, les actions suivantes seront entreprises :

- **Le Centre de données humanitaires (CHD)** informera le chef de bureau d'OCHA au Burkina Faso et les points focaux clé au siège d'OCHA (HFSA, CERF et OAD) par courrier électronique que le déclencheur a été atteint.
- **Le chef d'OCHA informera le CH/CR** et fournira un e-mail prérédigé pour informer les agences participantes. Le courriel précisera quel déclencheur a été atteint, quels secteurs sont activés, et quelles agences doivent prendre des mesures.
- **Le CH/CR informera l'EHP et les agences participantes** (FAO, UNFPA, UNHCR, UNICEF et PAM).
- **L'unité de programme CERF finalisera les documents du projet.** Celui-ci utilisera les propositions de projets et les budgets pré-soumis par chacune des agences. Le CERF préparera également la déclaration stratégique de l'allocation, en veillant à ce que les propositions soient adaptées à l'événement déclencheur spécifique. Le bureau de pays d'OCHA assurera la liaison avec les agences concernées.
- **Le secrétariat du CERF initiera le décaissement des fonds**, une fois les propositions de projet finalisées, permettant aux agences de démarrer leurs opérations.
- **Les agences mettront en œuvre dès que les lettres d'approbation du CERF seront envoyées.**

⁴ En raison de données historiques très limitées (seulement depuis 2017), il est difficile de confirmer la période de retour du choc. Dans les bases de données historiques, et depuis 2017, le déclencheur n'a été atteint qu'une seule fois (soit 1 fois sur 4 ans) mais le choc pourrait être plus ou moins fréquent.

- **La surveillance du CHD se poursuivra** si l'activation a lieu en mars. Si le déclencheur de juillet est atteint, le CHD en informera le chef du bureau d'OCHA et l'équipe pilote, et relancera le processus d'activation ci-dessus.

4. Plan de l'Action Anticipatoire

Critère de sélection

Les actions anticipatoires visent à atténuer l'impact humanitaire de la sécheresse, interrompant ainsi les voies décrites dans la section chronologie de la crise ci-dessus.

Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

1. **Caractère anticipatif** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire du choc ?
2. **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de mener l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ?
3. **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires ont-ils la capacité institutionnelle (thématique, logistique, administrative, financière, ressources humaines) pour mettre en œuvre efficacement l'action compte tenu du délai et de l'échelle ?
4. **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées impacteront-elles positivement plutôt que négativement à la population ciblée ?

Propriétés des interventions

Les actions convenues au préalable se concentreront sur les objectifs fondamentaux suivants :

- **Atténuer, prévenir et anticiper les risques de protection** parmi les groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les personnes à besoins spécifiques, face à la sécheresse prévue, grâce à l'amélioration des systèmes et des capacités de surveillance des risques, le renforcement des systèmes de référence et des services connexes, des messages de sensibilisation, ainsi que la distribution de kits de dignité et/ou de tout autre forme assistance matérielle (UNICEF, UNFPA et UNHCR).
- **Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance** contre les risques de sécheresse pour les communautés agricoles et pastorales, en mettant l'accent sur les plus vulnérables, à travers la fourniture d'une assistance en espèces (conditionnelle et inconditionnelle), la création d'actifs, la livraison de messages clés, et la fourniture d'intrants et assistance technique aux agriculteurs et éleveurs (FAO et PAM).
- **Atténuer la mortalité liée à la malnutrition** aiguë grâce à un dépistage précoce et à des soins de qualité pour les enfants âgés de 6 à 59 mois (UNICEF).
- **Garantir l'accès à l'eau** pour la consommation et l'assainissement pour éviter les maladies liées à la consommation de l'eau impropre y la malnutrition (UNICEF).

Sommaire

Objectif du Cadre AA : Réduire l'impact de la sécheresse annoncée sur les individus et les communautés vulnérables et à risque dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun par une action anticipatoire collective et intersectorielle.

Résultat	Secteur	Agence	Activités proposées
Atténuer le risque de protection parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les communautés hôtes, face à la sécheresse prévue.	Protection	UNFPA	- Fourniture de kits de dignité pour les femmes et les filles - Sensibilisation au risque et prévention VBG/PSEA - Formation de 30 gestionnaires de cas - Prise en charge des personnes survivantes de VBG
		UNHCR	- Sensibilisation et prévention des risques de Protection encourus par les personnes déplacées et les personnes à besoins spécifiques - Renforcement du suivi de protection et du système de surveillance - Améliorer et mener la gestion des cas et de référencement - Fourniture d'autres formes d'assistance matérielle pertinentes, y compris assistance via transferts monétaires lorsque possible
		UNICEF	- Sensibilisation aux risques de protection de l'enfance et à la prévention - Renforcement des systèmes de suivi de la protection de l'enfance - Améliorer les systèmes de référence et de gestion des cas
Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre le risque de sécheresse	Sécurité alimentaire (aide alimentaire) & Protection des Moyens d'existence	FAO	- Appui à l'agriculture pluviale (intrants, argent en espèce, appui technique/vulgarisation) - Soutien au bétail (argent en espèce, petit élevage et soutien vétérinaire) - Maraîchage (intrants, argent en espèce et soutien technique/vulgarisation) - Argent en espèce contre travail
		WFP	- Diffusion des alertes climatiques aux personnes vulnérables - Transferts monétaires conditionnels via la création d'actifs - Transferts monétaires inconditionnels via la protection sociale
Atténuer la mortalité liée à la malnutrition aiguë grâce à une détection précoce et des soins de qualité	Nutrition	UNICEF	- Renforcement du système de référence pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et de malnutrition aiguë modérée - Promotion des pratiques d'ANJE parmi les communautés ciblées - Supplémentation en micronutrition pour les enfants de 6 à 23 mois
Garantir l'accès à l'eau pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène	WASH	UNICEF	- Réhabilitation et construction de points d'eau - Formations communautaires sur la gestion de l'eau - Promotion de l'hygiène et distribution de kits d'hygiène

Pour un cadre logique détaillé, veuillez-vous référer à l'annexe 7.

Calendrier de mise en œuvre

Le calendrier de mise en œuvre est résumé ci-dessous.

Secteur	Agence	Déclenchement et décaissement des fonds	Délai de mise en œuvre	Durée
Protection	UNFPA	mi-mars	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	UNHCR			
	UNICEF			
Sécurité Alimentaire (Aide alimentaire & Moyens de subsistance)	FAO	mi-mars ET mi-juillet	75+ jours ET 30+ jours	6-12 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	WFP			
Nutrition	UNICEF	mi-juillet	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint
WASH	UNICEF	mi-mars	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint

Détails supplémentaires :

- Pour la période de mise en œuvre de 12 mois, spécifique à la FAO, les 9 premiers mois seront consacrés à la mise en œuvre des activités, et les 3 mois suivants, à la clôture et au S&E.

Ciblage

Les approches de ciblage à appliquer sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Géographie	Régions sélectionnées : Boucle de Mouhoun, Centre-Nord, Sahel, et Nord (au moins 10 % de la région doit remplir les critères de déclenchement) Cible géographique : Régions affectées par la sécheresse, Cadre Harmonisé (communes plus vulnérables) et accessibilité
Personnes affectées	Sécurité Alimentaire : ménages vulnérables des zones identifiées par le cadre harmonisé (FAO/PAM) et l'analyse de l'économie des ménages et registre des Personnes Déplacées Internes du Ministère en charge de l'Action Humanitaire (FAO), et registre de la protection sociale (PAM). WASH : l'UNICEF effectuera une évaluation rapide des besoins, en se concentrant sur les communautés (identifiées avec le Cadre Harmonisé) ayant des points d'eau non fonctionnels ou insuffisants pour faire face aux besoins. Protection : Le UNHCR, l'UNICEF, et le UNFPA cibleront les personnes déplacées, les femmes, les filles et les garçons par le biais des réseaux de protection existants (partenaires de mise en œuvre du Projet 21, prestataires de services, chefs de communautés locales et autres acteurs locaux). Nutrition : L'UNICEF ciblera les enfants âgés de 6 à 59 mois, les femmes enceintes, et les mères allaitantes en établissant des systèmes de référence au sein des communautés vulnérables identifiées par le Cadre harmonisé.

Supplément	Clusters assurant la planification des activités afin d'éviter les chevauchements au niveau ICCG et sectoriel.
-------------------	--

Inscription des bénéficiaires et la portée

Le nombre de bénéficiaires et les pratiques d'enregistrement des différentes agences sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Secteur	Agence	Système d'enregistrement des bénéficiaires	Nbres estimés des bénéficiaires ⁵
Protection	UNFPA	Le système de suivi et d'orientation peut être utilisé pour identifier/suivre les bénéficiaires.	15 000
	UNHCR		1 825
	UNICEF		30 000
Sécurité alimentaire & Moyens d'existence	FAO	Enregistrement Kobo	21 000
	WFP	Enregistrement dans la plateforme SCOPE	12 000
Nutrition	UNICEF	Le système de suivi et d'orientation peut être utilisé pour identifier/suivre les bénéficiaires.	300 000
WASH	UNICEF	Enregistrement effectué dans les institutions/communautés et soumis par le biais de rapports réguliers par les PA	50 000

Inscription des bénéficiaires et la portée

En préparation de ce projet pilote, les agences ont soumis des documents de planification détaillés décrivant les principales considérations liées aux activités qu'elles proposent. Ces fiches d'intervention contiennent les informations suivantes :

- Une description des interventions anticipées, y compris les objectifs et les résultats attendus
- Un synopsis de la portée anticipatoire des activités
- Entrées dans le calendrier des activités, y compris des informations sur la fenêtre d'opportunité spécifique, le délai nécessaire pour fournir une assistance, et la durée de mise en œuvre idéale
- Contributions des agences sur la préparation aux opérations, y compris des informations sur la présence des opérations dans la zone ciblée, les dispositions en matière d'approvisionnement, les accords contractuels et les partenaires de mise en œuvre
- Budget détaillé des activités pour la fenêtre d'opportunité

Après approbation du cadre d'action anticipatif par le CR/HC et l'ERC, les contributions des fiches d'interventions sont utilisées pour développer le dossier de candidature du CERF, comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence, et des budgets spécifiques à l'agence. L'objectif est de compléter le plus possible le dossier CERF en amont de l'éventuelle candidature. Cela permet de minimiser le temps de latence entre l'activation du déclencheur et le début de l'action anticipatoire critique, dans le temps.

⁵ Se rapporte aux individus et non aux ménages. Pour les estimations au niveau des ménages, divisez par 7, ce qui correspond à la taille moyenne des ménages. Veuillez noter qu'il s'agit d'une estimation de la portée potentielle. De plus, cela ne tient pas compte des bénéficiaires uniques. Les bénéficiaires peuvent accéder à différentes formules de soutien. Les chiffres réels des bénéficiaires seront connus lorsque l'action sera déclenchée.

L'état de préparation par agence dans chacun des secteurs est indiqué ci-dessous.

Secteur	Agence	Mesures de préparation
Protection	UNFPA	- Présence dans les 4 régions humanitaires ciblées - Disponibilité de personnel humanitaire du bureau, capable d'assurer les fonctions critiques en cas d'urgence - Disponibilité d'un plan d'action de préparation et d'exigences minimales pour les interventions humanitaires (MPA) du bureau UNFPA - Renforcement de capacités acteurs institutionnels (Santé et Action Sociale) et les ONG partenaires de mise en œuvre réalisé et en continu sur le Dispositif Minimum en Situation d'urgence (DMU), la gestion de cas de VBG, la collecte et la production de données sur les VBG, etc... - Existence de cartographie des services disponibles et des mécanismes de référencement dans les régions humanitaires où il a une présence - Installation en cours de 04 One Stop Center dans les zones humanitaires concernées par le projet - Existence d'un numéro vert « 80 00 12 87 » gratuits au niveau national pour le signalement des VBG pour les dénonciations des cas ou tentatives de ; VBG - Pré positionnement de kits dignité et de produits SSR - Des accords de partenariat établis avec divers partenaires (Etatique, ONGI, Agents à base communautaires) de mise en œuvre dans nos domaines d'intervention
	UNHCR	- La présence sur le terrain est confirmée dans la, ou les, zone(s) d'intervention - Dispositions contractuelles en place avec les PA - Analyse des données en place pour le ciblage (avec validation du gouvernement) - Des accords à long terme avec les sociétés commerciales pour la livraison des intrants et les accords de chaîne d'approvisionnement sont en place
	UNICEF	
Sécurité alimentaire & Moyens d'existence	FAO	
	WFP	
Nutrition	UNICEF	
WASH	UNICEF	

5. Financement pré-accordé

CERF

L'ERC a engagé jusqu'à 140 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies pour soutenir une série d'activités/actions anticipées. Au 4 octobre 2021, le CERF avait déboursé 63 millions de dollars pour des projets pilotes d'action anticipatoire au Bangladesh, en Éthiopie, en Somalie et au Népal.

Pour l'action pilote d'anticipation au Burkina Faso, l'ERC a engagé jusqu'à 15 millions de dollars du CERF pour une activation complète du cadre de lutte contre la sécheresse.

Les fonds du CERF seront débloqués sans regret une fois le déclencheur de l'action anticipatoire activé (voir Section 3). Si un déclencheur n'atteint pas son seuil convenu, le CERF ne versera pas de financement. Chaque composant déclencheur est évalué indépendamment. Le montant du financement des activités est clairement défini dans les propositions de projets et les budgets du CERF.

Tous les fonds seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF.

Le CERF décaisse les fonds une fois que trois conditions sont remplies :

- Approbation par le Coordonnateur Résident/Humanitaire du Cadre d'Action Anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets et des budgets spécifiques à chaque agence ; et

- Approbation par le Coordonnateur des secours d'urgence du cadre d'action anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation pré-convenue) ; et
- Activation du déclencheur pilote préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC.

La proposition de la ventilation budgétaire est comme suit :

Secteur	Agence	Total
Sécurité Alimentaire	FAO	\$ 5 500 000
	PAM	\$ 5 500 000
Nutrition	UNICEF	\$ 3 600 000
WASH		
Protection	UNHCR	\$ 200 000
	UNFPA	\$ 200 000
Total		\$ 15 000 000

6. Apprentissage

Aperçu

L'action anticipatoire collective reste un espace innovant. Ainsi, les pilotes facilités par OCHA investissent également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre étayé par un plan clair d'apprentissage, de suivi et d'évaluation. Chaque pilote est évalué pour déterminer si : 1) l'action humanitaire anticipatoire collective à grande échelle fonctionne et si l'approche anticipatoire conduit à une réponse ; 2) plus rapide ; 3) plus efficace (moins chère) ; et 4) plus digne.

L'apprentissage est organisé de manière relâchée le long de trois compartiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Surveillance de la livraison

S&E coordonné et spécifique à chaque agence pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus avec des questions et des indicateurs communs et coordonnés sur le calendrier, les résultats, la portée, et les défis.

Evaluation indépendante

Les évaluations indépendantes peuvent inclure : Une évaluation quantitative de l'impact de l'action anticipatoire sur le bien-être des ménages, à l'aide d'enquêtes auprès des ménages ; une évaluation qualitative pour évaluer l'expérience des bénéficiaires ; une évaluation des prévisions/déclencheurs pour évaluer les performances du modèle prédictif et identifier les moyens d'améliorer l'étalonnage et les performances du modèle.

Cadre logique commun

Chaque agence effectuera un suivi des activités sur la base d'un cadre logique préalablement convenu, permettant le partage et l'agrégation des données entre les agences/activités. Le suivi de la prestation de l'agence se concentrera sur les indicateurs de résultats, ainsi que de résultats préalablement convenus, et recueillera les données à ce sujet auprès d'un groupe de traitement et de comparaison établi lors de moments clés de la période de mise en œuvre, au moins une fois à la fin du cycle d'intervention. À cette fin, chaque agence a également nommé un point focal de S&E pour participer au groupe de S&E établi pour le pilote. En préparation ou pendant l'intervention, les agences recueilleront également les coordonnées des bénéficiaires et des groupes de comparaison, le cas échéant.

Les questions de haut niveau qui guident la surveillance de la livraison à travers les pilotes sont les suivantes :

- L'action d'anticipation a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment de l'intervention a-t-il eu une incidence sur l'impact des interventions sur le bien-être des ménages et la facilité de mise en œuvre ?
- Comparer les résultats des interventions d'anticipation avec des interventions similaires dans le passé qui se sont produites après la catastrophe.
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou de débordements ?

Sur la base de ces questions, les agences travaillant sur ce cadre se sont engagées à respecter le cadre logique commun de l'annexe 7, qui sera reflété dans l'allocation de chaque projet.

Annexe 1

Cadre logique

Objectif Principal : Réduire l'impact de la sécheresse prévue sur les individus et les communautés vulnérables et à risque dans les régions du Nord, du Centre Nord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun à travers une action anticipatoire collective et intersectorielle

Objectif	Sécurité Alimentaire Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse		Nutrition Réduire la mortalité liée à la malnutrition aigüe par un dépistage précoce et une prise en charge de qualité des enfants de 6 à 59 mois	WASH Garantir une bonne hygiène et l'accès à l'eau pour la consommation/production	Protection Atténuer les risques de protection par l'assistance communautaire et individuelle aux femmes, filles et garçons déplacés internes et hôtes		
Agence	PAM	FAO	UNICEF	UNICEF	UNFPA	UNICEF	UNHCR
Résultats	Protège et promeut la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse	Prévenir les risques de sécheresse et réduire leur impact sur les personnes exposées	Renforcer la préparation à une réponse nutritionnelle d'urgence au Burkina Faso	Garantir l'accès des populations vulnérables à une eau propre et sûre pour la consommation Améliorer les pratiques d'hygiène des populations vulnérables dans les zones affectées	Atténuation des risques et réponses multisectorielles aux violences basées sur le genre lié aux effets de la sécheresse	Protéger les enfants contre les violences liées aux effets de la sécheresse	L'accès au territoire est garanti pour les personnes sous mandat du HCR ayant des besoins de protection La prévention des groupes à risque y compris les enfants et les personnes handicapées est réalisée
Sortir des données (Outputs)	Dispositions préventives pour minimiser les effets du risque de sécheresse dans les populations plus vulnérables	Les moyens d'existence agricoles de ménages ruraux exposés aux risques et conséquences négatives de la sécheresse (personnes déplacées et communautés d'accueil) sont protégés et renforcés Les moyens d'existence pastoraux de ménages ruraux exposés aux conséquences négatives de sécheresse (personnes	Les plateformes communautaires ont les capacités requises pour le dépistage et le référencement des enfants malnutris vers les services adaptés La promotion des pratiques optimales d'ANJE est faite vers femmes et adolescentes enceintes et allaitantes à travers groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'ANJE (GASPA)	Proportion de communautés ciblées dans les districts sélectionnés abandonnant les mécanismes d'adaptation négatifs (c'est-à-dire allant chercher l'eau à des sources non protégées ou points d'eau trop éloignés des exposants à des risques accrus de protection).	Les risques des violences basées sur le genre dans le contexte de la sécheresse sont atténués	Violences liées aux effets de la sécheresse et prévenues, compris le renforcement d'un système d'identification et de référencement des enfants dans les besoins de protection	Le monitoring contribue à une amélioration de l'environnement de protection Appui aux environnements plus sûrs et atténuation des risques de violences basées sur le genre (VBG)

		déplacées et communautés d'accueil) sont protégés et renforcés	Les approches simplifiées sont mises en œuvre pour assurer la continuité des services de PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe)	Proportion de communautés ciblées pratiquant des normes d'hygiène correctes			
Activités	Mars : 1. Fournir des services climatiques basé sur les systèmes existants 2. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires conditionnels	Mars : 1. Distribution de cash + intrants de cultures vivrières pluviales (semences à variétés précoces et résistantes à la sécheresse + autres intrants) au profit de 2500 ménages vulnérables ; 2. Distribution de cash + intrants de cultures maraichères de saison sèche au profit de 1500 ménages vulnérables en vue d'atténuer les conséquences de la sécheresse ; 3. Réalisation de travail contre espèce par 2000 ménages vulnérables pour la réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques et d'ouvrages de CES/DRS en vue de la production agricole.	Juillet : 1. Intégration systématique de la formation des mères membres des GASPA sur la mesure du Périmètre Brachial (PB mère) et équipement en mètre ruban (Bande de Shakir) pour leur implication dans le dépistage précoce de la malnutrition aigüe chez leurs propres enfants. 2. Renforcement du système de référence et contre référence des enfants Malnutris Aigüe Sévère (MAS) et Malnutrition Aigüe Modérée entre le niveau communautaire et les formations sanitaires, 3. Pour la population hôte et les PDI résidant dans la communauté hôte : prévention de la malnutrition à travers la promotion des pratiques d'ANJE dans la communauté (GASPA : Groupe d'Apprentissage et de Suivi de Pratiques d'ANJE), la supplémentation en micro-nutriments (Vitamine A, et déparasitage) des enfants de 6-23 mois),	Mars : 5. La réhabilitation des points d'eau non fonctionnel, 6. L'installation de Poste d'eau autonome sur des forages à grand débit existant en vue d'optimiser les ressources, 7. Le renforcement des capacités des communautés dans la gestion préventive des ouvrages, 8. La distribution de kits d'hygiène pour le stockage et le transport de l'eau et le lavage des mains et 9. La promotion à l'hygiène pour la réduction des maladies hydriques dont les épidémies.	Mars : 1. 1. Distribuer 2000 kits de dignités 2. Sensibiliser 4200 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) sur la VBG pour la transmission des messages sur les services disponibles pendant la période de la sécheresse ; 3. Organiser des groupes de paroles avec 2400 femmes et filles pour discuter des mesures d'atténuation des risques de VBG dans le contexte de la sécheresse	Mars : 1. Elaborer et diffuser des messages de sensibilisation communautaires sur la prévention de séparation et des violences y compris les VBG/SEA 2. Renforcer mécanismes communautaires de protection de l'enfant pour une prévention efficace 3. Identifier les services sociaux et communautaires de base pour développer un système d'identification et de référencement et de prise en charge des enfants affectés par les effets de la sécheresse	Mars : 1. Mise en place des comités de protection et appui à la tenue des sessions 2. Identification des personnes à besoins spécifiques (PBS) 3. Assistance matérielle aux cas identifiés parmi les PBS 4. Renforcement des mécanismes d'engagement communautaire 5. Amélioration des mécanismes de référencement 6. Faciliter un accès sécurisé aux combustibles et à l'énergie, aux femmes et filles, afin de réduire les risques liés à la collecte de bois de chauffe
	Juillet : 3. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires conditionnels 4. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires inconditionnels	Juillet : 4. Fourniture de soins vétérinaires, d'aliment bétail et de cash + au profit du cheptel de 2000 ménages vulnérables à l'effet de mitiger l'impact de la sécheresse sur les moyens d'existence ;					

		5. Distribution d'animaux à cycle court (lapins, volailles, caprins) et de cash (modalité cash +) à 1000 ménages vulnérables exposés à la sécheresse pour renforcer et diversifier leurs moyens d'existence	4. Renforcement du système de santé à travers la formation de personnels de santé sur la mise en œuvre des approches simplifiées (dépistage et prise en charge sur les sites avancés), la dotation en outils de travail et l'appui technique pour la coordination de la nutrition dans les régions et les districts concernés.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Indicateurs

Résultat	Sécurité Alimentaire Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse		Nutrition Réduire la mortalité liée à la malnutrition aiguë par un dépistage précoce et une prise en charge de qualité des enfants de 6 à 59 mois	WASH Garantir une bonne hygiène et l'accès à l'eau pour la consommation / production	Protection Atténuer les risques de protection par l'assistance communautaire et individuelle aux femmes, filles et garçons déplacés internes et hôtes		
Agence	PAM	FAO	UNICEF	UNICEF	UNFPA	UNICEF	UNHCR
Indicateurs des résultats	Nombre de personnes vulnérables stabilisé et protégé vis-à-vis l'impact de la sécheresse	Au moins 50% des agriculteurs de culture pluviale et 70% des agriculteurs de cultures maraichères, appuyés par le projet, ont eu une production égale ou supérieure à la moyenne des derniers trois/5 ans. La production agricole moyenne des bénéficiaires des appuis de la FAO est de 10% supérieure à celle des agriculteurs de l'échantillon contrôle (agriculteurs avec profil socio-économique similaire et également affecté par la sécheresse, mais n'ayant pas reçu de soutien) Au moins les 60% des pasteurs soutenus par	Nombre de personnes bénéficiant d'une alimentation complémentaire ciblée. Nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë modérée inscrites à un programme d'alimentation complémentaire.	Pourcentage de personnes utilisant de l'eau en quantité suffisante et salubre ; pour boire, cuisiner, et pour l'hygiène personnelle Pourcentage de personnes démontrant des pratiques d'hygiène sûres ayant reçu une promotion de l'hygiène et/ou une distribution d'articles/matériels d'hygiène	Nombre de mécanisme communautaire de protection des violences basées sur le genre renforcés pour prévenir les effets de la sécheresse	Nombre de mécanisme communautaire de protection de l'enfant renforcés pour prévenir les effets de la sécheresse	Nombre de cas de protection identifiés % de cas identifiés ayant reçu une assistance % de cas identifiés et référencés ayant reçu une assistance Nombre de cas de VBG rapportés

		le projet n'ont pas perdu plus de 15% de leur cheptel ; La production de lait moyenne du cheptel des bénéficiaires des appuis du projet est de 30% supérieure à celle des pasteurs de l'échantillon contrôle (pasteurs avec profil socio-économique similaire et également affecté par la sécheresse, mais n'ayant pas reçu de soutien) L'évaluation ROI (Return on Investment – couts bénéfices) indique que pour chaque dollar investi dans la sauvegarde de la production agricole, cela a généré plus de 2 dollars de bénéfices économiques pour les bénéficiaires du projet					
Indicateurs des activités	Nombre de personnes bénéficiant de transferts monétaires inconditionnels spécifiques au secteur. Valeur totale des transferts monétaires inconditionnels spécifiques au secteur, distribués en USD. Nombre de personnes bénéficiant de transferts monétaires conditionnels.	Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis en intrants de cultures pluviales Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis en intrants de cultures maraichères Nombre de ménages ayant bénéficié de Cash for work Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis soins vétérinaires et	Pourcentage de personnes admises pour un traitement MAM, et qui se sont rétablies. Nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë sévère admises dans un programme d'alimentation thérapeutique. Pourcentage de personnes admises pour un traitement MAS, et qui se sont rétablies.	Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant un accès durable à au moins 15 l/j/p d'eau aux normes de qualité standards Nombre d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable réhabilitées ou construites Nombre d'abreuvoirs aménagés pour petits ruminants Nombre d'artisans réparateurs, AUE	Nombre de femmes et de filles bénéficiant de kits de gestion de l'hygiène menstruelle et/ou de kits dignité Nombre de communautés (PDI et non PDI) touchées par les messages qui sauvent les vies	Nombre de personnes, y compris les enfants (filles et garçons), les femmes et les hommes sensibilisées sur la protection et prévention des enfants aux effets de la sécheresse Nombre d'enfant affectés par les effets de la sécheresse qui sont identifiés et référés par les structures communautaires de protection de l'enfant vers les services sociaux de prise en charge	Nombre de personnes bénéficiant des services de base en matière de VBG (ex : gestion de cas, soutien psychosocial, gestion clinique du viol, PPE, etc....) Nombre des missions de suivi de la protection menées éclairant la réponse humanitaire. Nombre de mises à jour/rapports de la matrice de suivi des déplacements.

	Valeur totale des transferts monétaires conditionnels distribués en USD. Nombre de personnes informées des risques associés à la sécheresse.	aliments bétail pour protéger leur cheptel Nombre de ménages ayant bénéficié de noyaux d'élevage à cycle court	Nombre de personnes dépistées pour malnutrition aiguë. Nombre de personnes recevant des suppléments de vitamines et/ou de micronutriments. Nombre de personnes bénéficiant de formations et/ou de sessions de sensibilisation communautaire sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d'urgence.	formés et/ou redynamisés Nombre de personnes désagrégés par sexe et âge ayant bénéficié des activités de promotion à l'hygiène et mobilisation communautaire Nombre de ménages ayant reçu un kit d'hygiène pour le stockage et le transport de l'eau et le lavage des mains			Nombre de voies de référence établies et régulièrement mises à jour. Nombre de personnes bénéficiant de parcours de référence. Nombre de mécanismes de protection communautaire mis en place pour identifier, prévenir, atténuer et, répondre aux violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme.
--	--	--	--	--	--	--	--

Plan d'action par secteur

Food Security and Livelihoods


Mise en œuvre Actions Anticipatoires (AA)																											
Ciblage lié à l'agriculture/alimentaire																											
Déclenchement en mars				\$																			Legend				
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J							
FAO	Préparation opérationnelle Interne																										
	1. Distribution de variétés de semences pluviales à cycle court/à maturation rapide, et une aide en transferts monétaires																				\$	Financement					
	Démarrage																					Temps préparation des opérations					
	Distribution Intrants et Cash																					Etapes de mise en œuvre					
	Suivi - Encadrement technique des bénéficiaires																					Etapes évaluation et leçons apprises					
	2. Distribution de variétés de semences maraichères et une aide en transferts monétaires																										
	Démarrage et finalisation aspects opérationnels																										
	Distribution Intrants et Cash																										
	Suivi - Encadrement technique des bénéficiaires																										
	3. Réalisation de travaux de Cash for work pour la réhabilitation des sites maraichers, des ouvrages hydrauliques et d'ouvrages de CES/DRS en vue de la production agricole.																										
	Démarrage																										
	Distribution Cash et travaux - Suivi et encadrement technique																										
	4. Suivi/Evaluation - ROI et leçons apprises																										
	Enquête Baseline																										
	Collecte des données ROI AA1																										
	Collecte des données ROI AA2																										
	Analyse des données																										
	Rapport et Atelier Leçons apprises																										
WFP	Préparation opérationnelle Interne																										
	Fournir les services climatiques basés sur les systèmes existants																										

[illegible]

Nutrition

Mise en œuvre Actions Anticipation (AA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Declenchement en Juillet									\$																									Legend																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UNICEF NUTRITION	Preparation opérationnelle Interne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

UNFPA	Préparation opérationnelle Interne																			
	Distribution des kits de dignités																			
	Faciliter le référencement des cas de VBG auprès des services de prise en charge																			
	Disséminer les messages de sensibilisation communautaires sur la VBG, les services disponibles, et la mitigation des risques de VBG, y compris l'EAS.																			
UNICEF	Préparation opérationnelle Interne																			
	Elaborer et diffuser les messages de sensibilisation communautaires sur la prévention de séparation et des violences, y compris les VBG/SEA a l'endroit de 30.000 personnes, y compris les enfants, suite aux effets de la sécheresse																			
	Renforcer 50 mécanismes communautaires de protection de l'enfant pour une prévention efficace contre les effets de la sécheresse																			
	Identifier les services sociaux et communautaires de base pour développer un système d'identification et de référencement et de prise en charge de 500 enfants affectés par les effets de la sécheresse																			

Analyse des risques de référence

Analyse des risques de référence pour le Burkina Faso, accessible ici: https://ocha-dap.github.io/pa-anticipatory-action/analyses/bfa/docs/bfa_risk_overview.html

Equipe pilote

Composition de l'équipe pilote au Burkina Faso :

Secteurs	Agences	Noms et Titres	Contacts
Protection	UNFPA	Edith OUEDRAOGO Dalomi BAHAN	eouedraogo@unfpa.org bahan@unfpa.org
	UNHCR	Jacques DE GINESTEL (Associate External Relations and Reporting Officer) Serge ATSOMAUTSY (Senior Protection Officer)	deginest@unhcr.org atsomaut@unhcr.org
	UNICEF	Bilal SOUGOU (Responsable programmation)	bsougou@unicef.org
Sécurité Alimentaire	FAO	Mamoudou TAMBOURA (Point focal technique) Adama DIAKITÉ (Suivi-évaluation)	Mamoudou.Tamboura@fao.org adama.diakite@fao.org
	WFP	Liam Wylie (Partnerships Officer) Tiga NEYA (Programme Policy Officer)	liam.wylie@wfp.org tiga.neya@wfp.org
Nutrition	UNICEF	Bilal SOUGOU (Responsable programmation)	bsougou@unicef.org
WASH	UNICEF	Bilal SOUGOU (Responsable programmation)	bsougou@unicef.org
OCHA		Vedaste Kalima, Head of Office Makiha KIMURA, Head of Coordination Stephanie LOLK LARSEN, Humanitarian Affairs Officer Julia Wittig, Humanitarian Affairs Officer CERF Tristan Downing, Data Scientist, CHD	vedaste@un.org kimuram@un.org stephanie.larsen@un.org wittigj@un.org tristan.downing@un.org

Annexe 2 – Mise à jour de juillet 2023

Introduction

Il a été noté précédemment que le Burkina Faso est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, notamment en ce qui concerne la sécheresse. Les précipitations sont souvent insuffisantes et irrégulières, malgré les risques d'inondations dans certaines localités lors de la saison des pluies, ce qui entraîne des pénuries d'eau et une diminution de la productivité agricole. Il est d'autant plus important de considérer les conséquences climatiques au Burkina Faso du fait de leur impact sur les populations déjà vulnérabilisées par la crise humanitaire et l'insécurité qui persistent au pays.

En effet, depuis l'élaboration de ce cadre, l'analyse du Cadre Harmonisé de mars 2023 a relevé que 2 provinces du Sahel étaient déjà en phase d'urgence (PH4) ; 9 provinces sur les 22 que comptent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Nord, de l'Est et du Sahel étaient en phase crise (PH3) ; et 16 provinces en phase sous pression (PH2). Si rien n'est fait d'ici juin 2023, le nombre de provinces en phase de crise à pire (PH3+) risque de passer de 11 à 15 dont 6 provinces en urgence dans les régions du Sahel (4), du Nord (1) et de la Boucle du Mouhoun (1), avec une population vulnérable nécessitant une assistance immédiate de 3 351 048 personnes. Ces personnes qui représentent près de 15% de la population totale seraient concentrées dans les régions du Sahel (21%), du Centre-Nord (16%), de l'Est (16%), du Nord (14%) et de la Boucle du Mouhoun (12%).

L'équipe pilote ayant travaillé sur l'action anticipatoire au Burkina Faso propose ainsi l'ajout de deux éléments observationnels au mécanisme de déclenchement, à savoir le Standard Precipitation Index (SPI) et le Water Requirement Satisfaction Index (WRSI), dans le but d'assurer que des mesures anticipatoires puissent être mise en œuvre si des conditions de sécheresse sévères devaient survenir, malgré des prévisions pluviométriques indiquant une période au-dessus de la normale entre juin et octobre. En intégrant le SPI et le WRSI dans le processus de planification et de gestion de la sécheresse, des mesures anticipées peuvent ainsi être prises pour atténuer les conséquences économiques, sociales et environnementales de la sécheresse, et ainsi réduire l'impact sur les populations vulnérables. Cette approche proactive aide en effet à réduire les risques pour les communautés, les écosystèmes et les systèmes agricoles, et favorise la résilience face aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes.

Tandis que le mécanisme adopté repose sur les prévisions saisonnières pour les périodes de juin, juillet, août (déclencheur mars) et août, septembre, octobre (déclencheur juillet), ces nouveaux éléments observationnels seront basés sur l'observation des tendances pluvieuses durant les mois de juillet, août et septembre pour une activation immédiate d'un paquet d'activités multisectorielles sur une durée de 9 mois (6 mois de mise en œuvre et 3 mois de suivi et évaluation). Il est pertinent de noter que pendant la période observée (juillet-septembre), peu de données sont disponibles pour faire un état des lieux des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle (e.g. le Cadre Harmonisé est fait au mois de novembre). **Il demeure qu'une intervention potentielle, motivée par une analyse à la mi-saison ou vers la fin de la saison pluvieuse, permettrait d'anticiper l'impact sur la récolte principale (septembre à décembre) ou récolte maraîchère (janvier à février).**

Déclencheurs observationnels

Standard Precipitation Index (SPI)

Le SPI-1 est un indice standardisé qui mesure les écarts par rapport à la normale des précipitations sur une période donnée, dans ce cas, le mois qui précède (30 jours). Il permet d'évaluer la quantité de précipitations reçues dans une région donnée, et si les valeurs sont négatives, cela indiquera une pluviométrie déficitaire par rapport à la moyenne. Dans le cadre de l'utilisation de ce déclencheur observationnel dans le contexte du Burkina Faso, **le seuil sera atteint si la valeur du SPI-1 inférieure à -1,5 sur au moins 30% de la zone.**

Water Requirement Satisfaction Index (WRSI)

Le WRSI est un indice qui mesure la performance d'une récolte, dans ce cas le sorgho, basé sur la disponibilité de l'eau aux plantes aux cours de leur cycle de croissance. Il tient compte des précipitations, de l'évaporation potentielle, de la capacité de rétention en eau du sol et d'autres facteurs. Le WRSI permet d'évaluer l'adéquation entre les ressources en eau disponibles et les besoins en eau des cultures. Cela aide à déterminer si des mesures d'irrigation supplémentaires sont nécessaires pour prévenir les stress hydriques et minimiser les impacts de la sécheresse sur les rendements agricoles. Dans le cadre de l'utilisation de ce déclencheur observationnel dans le contexte du Burkina Faso, **le seuil sera atteint si la valeur du WRSI est inférieure à une valeur de 75 sur au moins 30% de la zone.**


L'un ou l'autre de ces critères (SPI-1 inférieur à -1,5 ou WRSI inférieur à 75) peut indépendamment déclencher une activation du cadre.

Suivi et activation

Les données des deux déclencheurs seront surveillées et analysées par le Centre des Données Humanitaires (CDH) de OCHA, basées sur la collecte des données provenant de NOAA CMORPH⁶ (SPI) et de l'outil GeoWRSI⁷ de UCSB (WRSI), et permettront d'établir si le seuil de déclenchement est atteint et d'activer la programmation des activités de la fenêtre 1 du cadre de l'action anticipatoire, telle que révisée dans cet Annexe 2.

Mois du calendrier	Indicateur	Période observée	Moment du calcul
Juillet	SPI-1	2-31 juillet	3 août
	WRSI	Début de saison ⁵ à la troisième décade de juillet (21 ^e décade) inclusivement	
Août	SPI-1	2-31 août	3 septembre
	WRSI	Début de saison ⁸ à la troisième décade d'août (24 ^e décade) inclusivement	
Septembre	SPI-1	1-30 septembre	3 octobre
	WRSI	Début de saison ⁵ à la troisième décade de septembre (27 ^e décade) inclusivement	

Il est à noter que cette nouvelle fenêtre programmatique ne peut être activée qu'une seule fois dans l'année (août, septembre ou octobre). C'est-à-dire, si le seuil de déclenchement est atteint pour l'indicateur SPI ou WRSI à la fin du mois d'août, l'activation programmatique sera lancée et ne pourra donc pas être relancée pour les moments potentiels d'activation suivants (e.g. septembre et octobre).

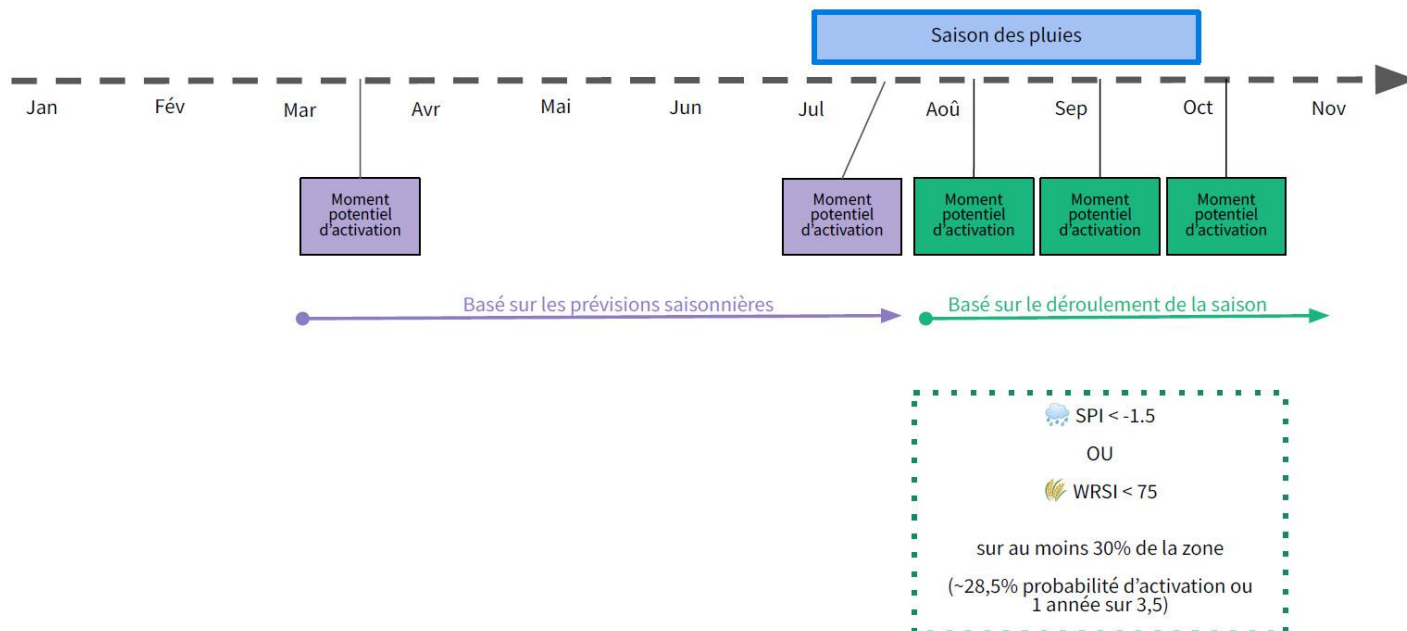

⁶ <https://www.drought.gov/data-maps-tools/global-gridded-standardized-precipitation-index-spi-cmorph-daily>

⁷ <https://www.chc.ucsb.edu/tools/geowrsi>

⁸ La période observée pour le SPI-1 commence le deuxième jour du mois en juillet et août parce que les valeurs sont agrégées sur 30 jours. Le WRSI, par définition, est agrégé depuis le début de saison. Le début de saison est basé sur le début des pluies, qui est défini comme la première décade où a) il est tombé au moins 25 mm de pluie, et b) est suivi par deux décades où il est tombé au moins 20 mm de pluie pendant chacune. Le début de saison est calculé séparément pour chaque pixel.

Le même protocole d'activation pour les déclencheurs prédictifs de mars et juillet sera suivi pour le déclencheur observationnel.

Programmation

La programmation initiale de ce modèle pilote consistait en deux fenêtres d'activités distinctes pour les déclenchements au mois de mars et juillet. L'équipe pilote de l'action anticipatoire au Burkina Faso a jugé pertinent de maintenir les activités de Protection, Nutrition et WASH (UNHCR, UNICEF, UNFPA) pour les 3 moments potentiels d'activation ajoutés, et ainsi les coupler avec l'aide alimentaire et les moyens de subsistance (WFP, FAO) pour assister les populations impactées par le choc de la sécheresse. Il s'agira ainsi de livrer un paquet d'activités multisectorielles dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Le calendrier de mise en œuvre est résumé ci-dessous.

Secteur	Agence	Déclenchement et décaissement des fonds	Délai de mise en œuvre	Durée
Protection	UNHCR	Fin-août, fin-septembre OU fin-octobre	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	UNFPA			
	UNICEF			
Sécurité Alimentaire	FAO	Fin-août, fin-septembre OU fin-octobre	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	WFP			
Nutrition	UNICEF	Fin-août, fin-septembre OU fin-octobre	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint
WASH	UNICEF	Fin-août, fin-septembre OU fin-octobre	75+ jours	6 mois débutant quand le déclencheur est atteint

Il s'agira ainsi de mettre en œuvre les priorités suivantes, telles que définies dans le document principal :

- Atténuer les risques de protection (UNFPA, UNHCR, UNICEF)
- Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance (WFP, FAO)
- Atténuer la mortalité liée à la malnutrition aigüe (UNICEF)
- Garantir l'accès à l'eau potable (UNICEF)

Les activités de mise en œuvre pour la 3^e fenêtre sont résumées ci-dessous (et regroupe les activités prévues pour les fenêtres 1 et 2) :

Résultat	Secteur	Agence	Activités proposées	Nombres estimés de bénéficiaires	Budget (USD)
Atténuer le risque de protection parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les communautés hôtes, face à la sécheresse prévue.	Protection	UNFPA	- Fourniture de kits de dignité pour les femmes et les filles - Sensibilisation au risque et prévention VBG/PSEA - Formation de 30 gestionnaires de cas - Prise en charge des personnes survivantes de VBG	15 000	200 000
		UNHCR	- Sensibilisation et prévention des risques de Protection encourus par les personnes déplacées et les personnes à besoins spécifiques - Renforcement du suivi de protection et du système de surveillance - Améliorer et mener la gestion des cas et de référencement - Fourniture d'autres formes d'assistance matérielle pertinentes, y compris assistance via transferts monétaires lorsque possible	1 825	200 000
		UNICEF	- Sensibilisation aux risques de protection de l'enfance et à la prévention - Renforcement des systèmes de suivi de la protection de l'enfance - Améliorer les systèmes de référence et de gestion des cas	30 000	200 000
Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre le risque de sécheresse	Sécurité alimentaire (aide alimentaire & Protection des Moyens d'existence	FAO	- Soutien au bétail (argent en espèce, petit élevage et soutien vétérinaire) - Maraîchage (intrants, argent en espèce et soutien technique/vulgarisation) - Argent en espèce contre travail	21 000	3 000 000
		WFP	- Diffusion des alertes climatiques aux personnes vulnérables - Transferts monétaires conditionnels via la création d'actifs - Transferts monétaires inconditionnels via la protection sociale	12 000	3 000 000
Atténuer la mortalité liée à la malnutrition aiguë grâce à une détection précoce et des soins de qualité	Nutrition	UNICEF	- Renforcement du système de dépistage précoce et de référencement pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et de malnutrition aiguë modérée - Prise en charge nutritionnelle et médicale des enfants MAS - Promotion des pratiques optimales d'ANJE et d'hygiène parmi les communautés ciblées	300 000	500 000

			• Supplémentation en micronutrition pour les enfants de 6 à 59 mois		
Garantir l'accès à l'eau pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène	WASH	UNICEF	• Réparation/Réhabilitation et construction de points d'eau • Formations communautaires sur la gestion de l'eau • Promotion de l'hygiène • Distribution d'articles essentielles pour le stockage et le traitement de l'eau, ainsi que le maintien de bonnes pratiques d'hygiène	50 000	2 400 000

Les détails du cadre logique sont compris dans l'annexe 1 de ce document.

Financement pré-accordé

Les fonds du CERF ne seront débloqués qu'une fois que le déclencheur observationnel sera activé. Les fonds du CERF ne seront alloués contre le moment d'activation que s'il n'y pas eu d'activation pour les moments d'activation au mois de mars et juillet. Pour les règles applicables et les montants exacts, veuillez-vous reporter au document principal.

Scénarios possibles

L'ajout de moments potentiels d'activation laisse place à divers cas de figure d'activation, comme suggéré dans le tableau ci-dessous :

Scénario	Moment d'activation	Activités planifiées	Budget	
Scénario 1	Déclenchement en mars et juillet	Protection, sécurité alimentaire, WASH, nutrition	14.5M	Scénarios initiales
Scénario 2	Déclenchement en mars	Protection, sécurité alimentaire, WASH	9M	
Scénario 3	Déclenchement en juillet	Sécurité alimentaire, nutrition	5.5M	
Scénario 4	Déclenchement en juillet et en août/septembre/octobre	Protection, sécurité alimentaire, WASH, nutrition	15M	Scénarios additionnels
Scénario 5	Déclenchement en août/septembre/octobre	Protection, sécurité alimentaire, WASH, nutrition	9.5M	

Il a été convenu par l'équipe pilote que si le seuil de déclenchement est atteint au mois de mars, l'activation des moments déclencheurs en août/septembre/octobre, basée sur les données observationnelles, ne sera pas possible.

Apprentissage

La même procédure d'apprentissage pour l'activation du déclencheur observationnel s'appliquera telle que décrite dans le document principal.
