



ANTICIPATORY ACTION FRAMEWORK

BURKINA FASO
Sécheresse



Cadre de l'Action Anticipatoire

Pilote de la Sécheresse au Burkina Faso

18 novembre 2021 - Ebauche

1. Résumé

L'objectif de ce document est de présenter le cadre d'Action Anticipatoire (AA) contre la sécheresse au Burkina Faso, y compris le déclencheur de prévision (le modèle), les plans d'action préétablis (la livraison) et le financement pré-arrangé (le financement).

L'objectif du projet pilote est d'atténuer l'impact de la sécheresse sur les individus et les communautés vulnérables, et à risque, au Burkina Faso grâce à une action anticipatoire collective et intersectorielle. Le pilote se concentre sur les régions sujettes à la sécheresse et très vulnérables de la Boucle de Mouhoun, du Centre Nord, du Sahel, et du Nord. Le projet pilote a le potentiel d'atteindre plus de 800.000 personnes avec un ensemble intégré de soutiens avant le début de la sécheresse.

Le modèle utilise deux déclencheurs basés sur les prévisions axées sur les précipitations pendant les moments clés de la saison des pluies. Les prévisions utilisées sont générées par l'Institut International de Recherche de l'Université de Columbia. Les déclencheurs fonctionnent comme suit :

- **Déclencheur I** : En mars, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne au cours de la période juin, juillet et août, des fonds seront débloqués pour le démarrage des activités par tous les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence) la nutrition, la protection, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
- **Déclencheur II** : En juillet, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne en août, septembre et octobre, des fonds sont débloqués pour la mise en œuvre d'activités par le secteur de la sécurité alimentaire (aide alimentaire + protection des moyens d'existence).

Bien qu'étroitement liés, chaque déclencheur (I et II) est indépendant. En tant que tel, l'action anticipatoire des différents secteurs repose sur le respect du déclencheur respectif, et dans ce contexte, une activation partielle du plan d'action est possible.

La mise en œuvre d'une action anticipatoire est guidée par un plan d'action préapprouvé qui sera mis en œuvre par cinq agences des Nations Unies - la FAO, le HCR, l'UNFPA, l'UNICEF et le PAM - en partenariat avec les ONG, et en étroite coordination avec les autorités locales. Le plan d'action convenu au préalable comprendra les actions suivantes :

- **Atténuer les risques de protection** parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays face à la sécheresse prévue grâce à l'amélioration des systèmes et des capacités de surveillance des risques, le renforcement des systèmes de référence, et des services connexes, des messages de sensibilisation, l'accompagnement psychosocial des enfants et familles en détresse, ainsi que la distribution de kits de dignité (UNICEF, UNFPA et UNHCR).
- **Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance** contre les risques de sécheresse pour les communautés agricoles et pastorales, en mettant l'accent sur les plus vulnérables, à travers la fourniture d'une assistance en espèces (conditionnelle et inconditionnelle), la création d'actifs, la livraison de messages clés, et la fourniture d'intrants et assistance technique aux agriculteurs et éleveurs (FAO et PAM).
- **Atténuer la mortalité** liée à la malnutrition aiguë grâce à un dépistage précoce et à des soins de qualité pour les enfants âgés de 6 à 59 mois (UNICEF).
- **Garantir l'accès à l'eau** pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène (UNICEF).

Le financement du cadre provient du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF). L'accord de financement préétabli avec le CERF engage jusqu'à 15 millions de dollars pour une action anticipatoire contre la sécheresse. Le financement ne peut être débloqué que lorsque les déclencheurs respectifs sont atteints.

2.Introduction

Objectifs de l'Action Anticipatoire

Il existe un large accord au sein du secteur humanitaire international sur la nécessité de passer d'une approche largement réactive à une approche anticipatoire. Une approche anticipatoire conduira à une réponse plus efficace, et digne. Il protège également les gains de développement durement acquis.

Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'occurrence et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques avec une certitude croissante. En tirant parti des différentes approches analytiques, les événements météorologiques inhabituels peuvent non seulement être prédits, mais leurs impacts projetés peuvent être atténués de manière proactive sur la base d'actions anticipatoire pré-identifiées.

Sur base de preuves croissantes, agir avant l'apparition d'un danger prévisible est nettement plus efficace (coût moindre) que la réponse humanitaire traditionnelle, ce qui a encouragé OCHA à faciliter la mise en place de plusieurs cadres d'action anticipatoire.

Un cadre d'action anticipatoire comprend trois éléments de base, qui sont tous étayés par un plan clair d'apprentissage, de suivi, et d'évaluation :

- Une prévision robuste intégrée dans un processus décisionnel clair (le **modèle**).
- Des plans d'action convenus à l'avance qui peuvent modifier fondamentalement la trajectoire de la crise (la **livraison**).
- Un financement préétabli (le **financement**).

L'action collective anticipatoire reste un espace innovant. En plus des trois éléments de base, OCHA investit également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre, étayés par des plans d'apprentissage, de suivi et d'évaluation clairs.



Principe de base

Voici les principes fondamentaux qui orientent le pilote d'action d'anticipation de la sécheresse au Burkina Faso. Ces principes sont intégrés et maintenus dans les différentes composants et processus du cadre de l'action anticipatoire.



- **Poursuivre une programmation de qualité** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre de l'action anticipatoire sont chargés de poursuivre et de garantir une programmation de qualité conforme au contexte et aux besoins, en particulier, des plus vulnérables.

- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : Les partenaires doivent donner la priorité aux interventions multisectorielles et co-ciblées, lorsque cela est possible, afin de maximiser les synergies et d'obtenir un impact important.
- **Garantir la centralité de la protection** : Conformément à la politique de centralité de la protection de l'IASC et au principe de « ne laisser personne de côté » (Agenda 2030), tous les partenaires mettant en œuvre d'interventions anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggraverait pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion, et d'exploitation. Les actions anticipatoires doivent également garantir qu'elles bénéficient à toutes les communautés (communautés locales, communautés déplacées, rapatriés et réfugiés) en fonction de leurs besoins, tout en tenant compte des obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap, ou à l'appartenance sociale.
- **Promouvoir la redevabilité envers les populations affectées** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre de l'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des approches de redevabilité de leurs activités envers les populations affectées. Cela inclut tous les efforts pour solliciter, entendre, et agir sur les voix et les priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et victime ou à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action d'anticipation. Cela signifie également s'assurer que les commentaires de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions d'anticipatoires.
- **Soutenir la localisation** : Tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre doivent honorer l'engagement de l'HCT envers la localisation. Des partenariats équitables avec les acteurs locaux s'appuyant sur leurs relations à long terme et la confiance avec les communautés lors de l'action anticipatoire sont cruciaux.
- **S'engager dans des partenariats** : La collaboration entre les acteurs humanitaires est essentielle pour garantir l'engagement de tous les secteurs, et que l'aide soit mobilisée conformément au cadre des AA.
- **Utilisation d'espèces lorsque cela est possible** : La communauté humanitaire encourage l'utilisation d'espèces comme modalité d'assistance par défaut lorsque les marchés et les contextes opérationnels le permettent, afin de promouvoir la dignité et renforcer la résilience des populations affectées.
- **Générer des co-bénéfices pour le développement** : Les participants au projet pilote sont encouragés à examiner comment le financement d'une action anticipatoire peut compléter le financement du développement en réduisant les souffrances et en s'attaquant aux causes profondes des problèmes. Par exemple, si le plan d'action anticipatoire convenu à l'avance inclut la réparation des forages, les agences de mise en œuvre doivent s'assurer que la qualité des réparations durera au-delà de la crise humanitaire immédiate.
- **Capter l'apprentissage** : Les activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage doivent être intégrées à chaque phase du développement et de la mise en œuvre du cadre de l'AA.
- **Viser l'intégration** : Le cadre cherche à intégrer les activités de l'action anticipatoire dans l'architecture humanitaire existante et à favoriser les liens avec la programmation à long terme, y compris les initiatives de résilience et de développement.

Sècheresse au Burkina Faso

Exposition


Le climat du Burkina Faso est caractérisé comme un climat tropical sec. Le pays a trois zones climatiques distinctes, dont la zone du nord « sahélienne », la zone du centre « soudano-sahélienne », et la zone sud « soudanienne », qui divisent globalement le pays en trois bandes horizontales. Les précipitations moyennes sont les plus faibles dans la zone sahélienne (600 mm de moyenne annuelle), suivie de la zone nord-soudanienne (600-900 mm de moyenne annuelle), puis de la zone sud-soudanienne (900+ mm de moyenne annuelle). Les précipitations observées au 20^{ème} siècle ont montré une tendance à la baisse des précipitations annuelles totales sur l'ensemble du pays et du nombre de jours de pluie, ainsi qu'une tendance à la hausse du nombre de jours secs consécutifs (de 46 à 57 jours par décennie). De plus, l'analyse montre une plus grande variabilité saisonnière et interannuelle. Les projections des modèles climatiques indiquent que ces tendances négatives se poursuivront. Sur la base de ces éléments, le climat futur devrait être caractérisé par un réchauffement continu, une forte variabilité des précipitations, et la survenue d'événements météorologiques et climatiques extrêmes, en particulier, la sécheresse.

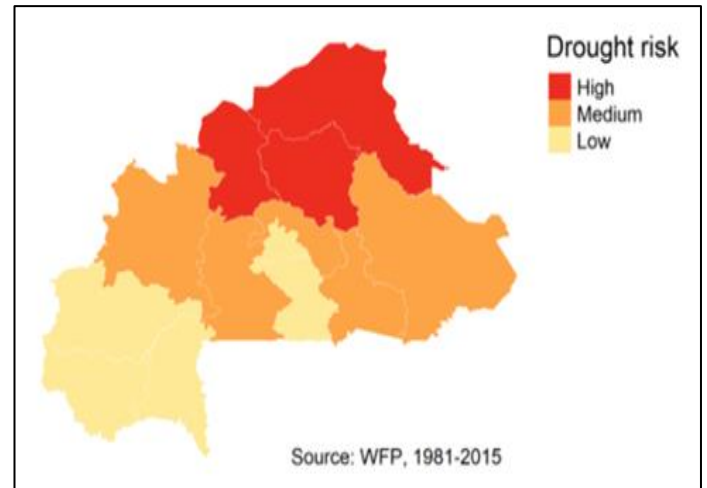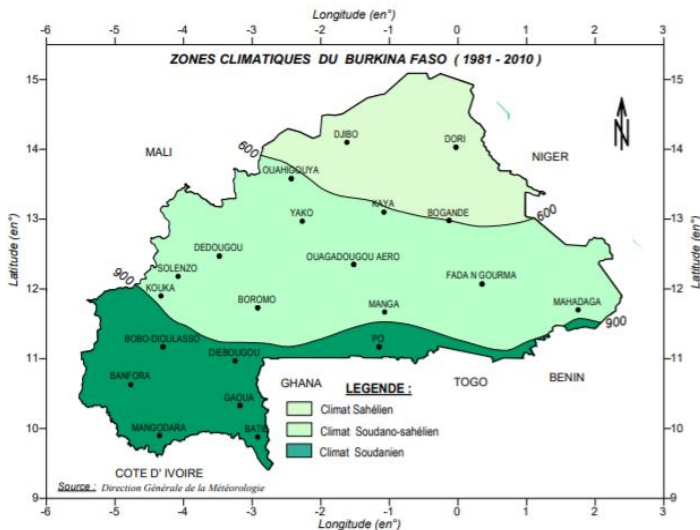

Vulnérabilité

Si l'exposition à la sécheresse est élevée, la vulnérabilité l'est aussi. La vulnérabilité découle en grande partie de la dépendance à l'égard des précipitations. L'économie du pays dépend fortement des précipitations pour presque tous ses besoins en eau, y compris l'agriculture. L'agriculture contribue à un tiers du PIB du pays, soit 80% des moyens de subsistance de la population. Les capacités d'adaptation sont limitées, avec près de la moitié de la population (46 %) vivant en dessous du seuil de pauvreté, n'ayant pas les moyens de gérer les risques et de résister aux chocs. Les capacités institutionnelles ont également été érodées, à la suite d'événements de chocs récurrents et des réponses humanitaires associées. Au cours de la période 1969 à 2014, les sécheresses ont touché un nombre cumulé de 12,4 millions de personnes.

La vulnérabilité découle également des conflits. Le conflit armé a commencé en 2015 et s'est aggravé depuis 2018. En 2020, en raison de la violence et des déplacements subis, le Burkina Faso est devenu l'une des crises humanitaires les plus importantes et les plus rapides au monde. Beaucoup ont perdu l'accès aux ressources et aux moyens de subsistance, délimitant leurs options de gestion des risques pour résister à un choc.

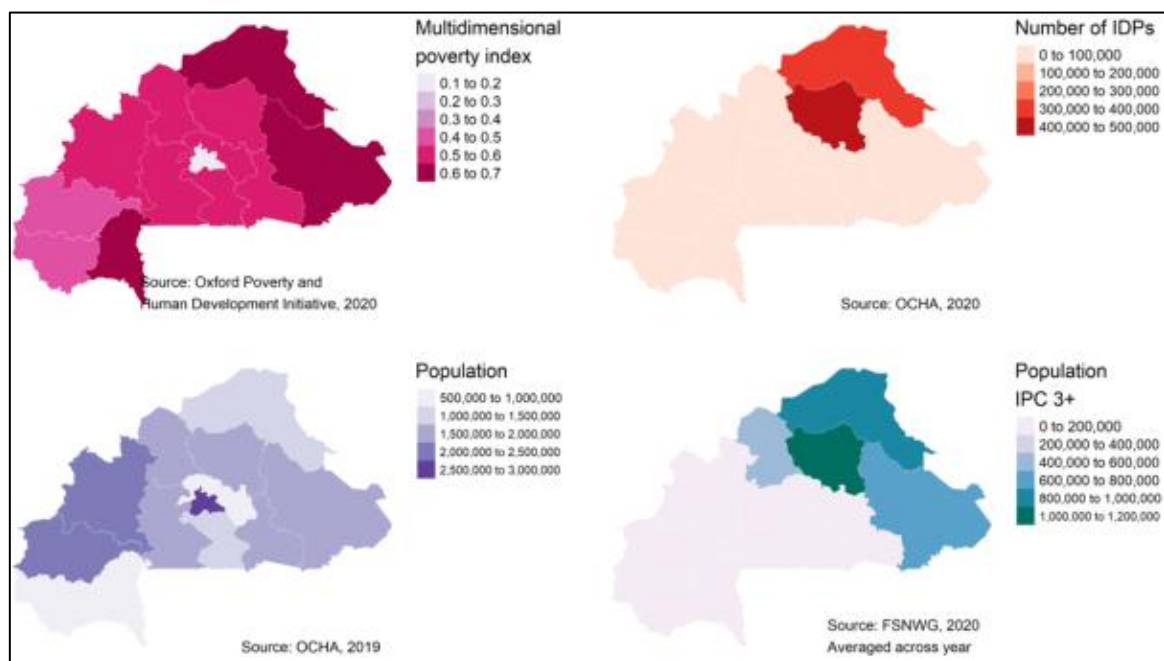


Impact humanitaire

Depuis le début des années 1970, le Burkina Faso est touché par des sécheresses récurrentes. Au cours de la période 1969 à 2014, les sécheresses ont touché un nombre cumulé de 12,4 millions de personnes. Cela fait de la sécheresse le

principal moteur des besoins humanitaires avant la survenue de la crise sécuritaire. Au cours de cette période, les impacts de la sécheresse ont été notés comme étant les plus graves en 1980, 1990, 2011 et 2014. Ces dernières années, les observations montrent que l'impact de la sécheresse est devenu plus fréquent et plus répandu. Les impacts couramment cités de la sécheresse incluent l'épuisement de l'eau et d'autres ressources naturelles, la réduction des rendements des cultures, la réduction de la qualité et de la quantité du bétail, une incidence plus élevée de malnutrition et de maladie, ainsi que des marchés et des mécanismes financiers déstabilisés.


En phase courante du Cadre Harmonisé (CH) (octobre, novembre, décembre 2021), 5 provinces sur 16 que comptent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Nord et du Sahel étaient déjà en phase crise (Ph3) et 6 provinces en phase sous pression (PH2). Si rien n'est fait d'ici juin 2022, 10 de ces 16 provinces se retrouveront en phase crise à pire (ph3+) dont 3 provinces en urgence avec une population en insécurité alimentaire qui avoisinerait 1 720 000 personnes (soit 65% de l'effectif national des personnes en phase 3+). En outre, 9 provinces ont un accès limité à cause de l'insécurité.

La combinaison de besoins humanitaires chroniques et aigus fait en sorte que tout événement futur de sécheresse peut créer une grande force de déstabilisation, entraînant des conditions de crise.

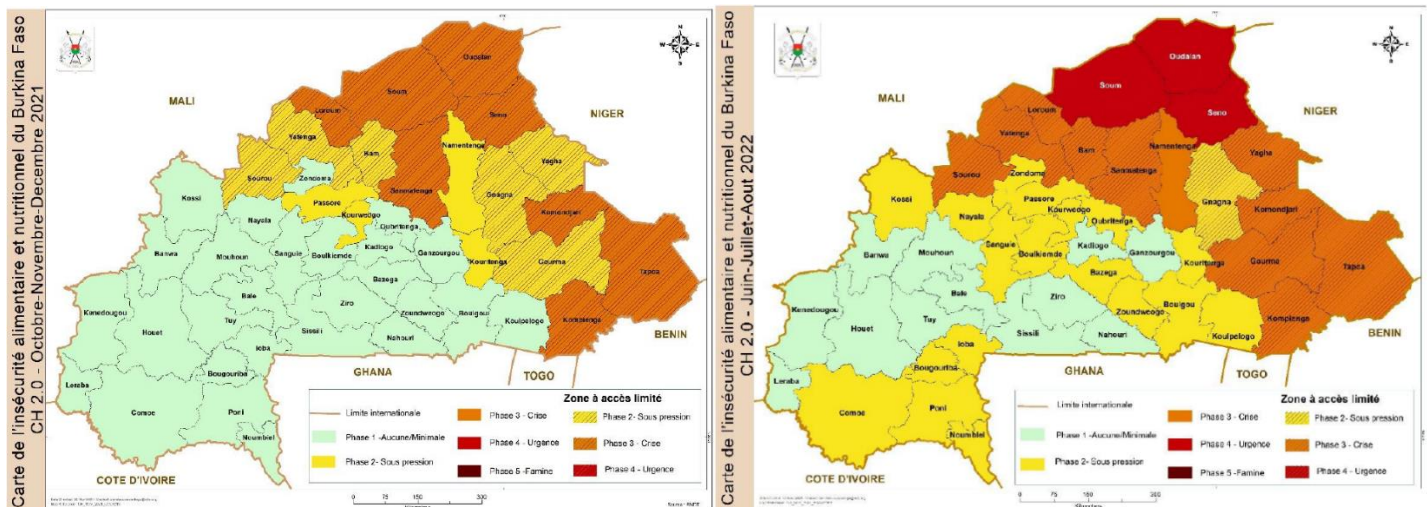

Orientation Géographique

L'analyse historique indique que les épisodes de sécheresse suivent la division de la zone climatique dans le pays. Le nord du pays est le plus touché, suivi de la région centrale et enfin de la région sud. En particulier, les endroits touchés par la sécheresse sont également des zones avec une pauvreté multidimensionnelle prononcée, un nombre très important de personnes déplacées internes, et des personnes affectées par des besoins humanitaires aigus. En tant que telles, les régions ciblées sélectionnées et convenues avec l'équipe humanitaire de pays comprennent la Boucle de Mouhoun, le Centre Nord, le Sahel et le Nord. Cela chevauche les régions prioritaires identifiées par le Plan de réponse humanitaire du Burkina et où l'ONU a accordé la priorité à l'aide humanitaire.

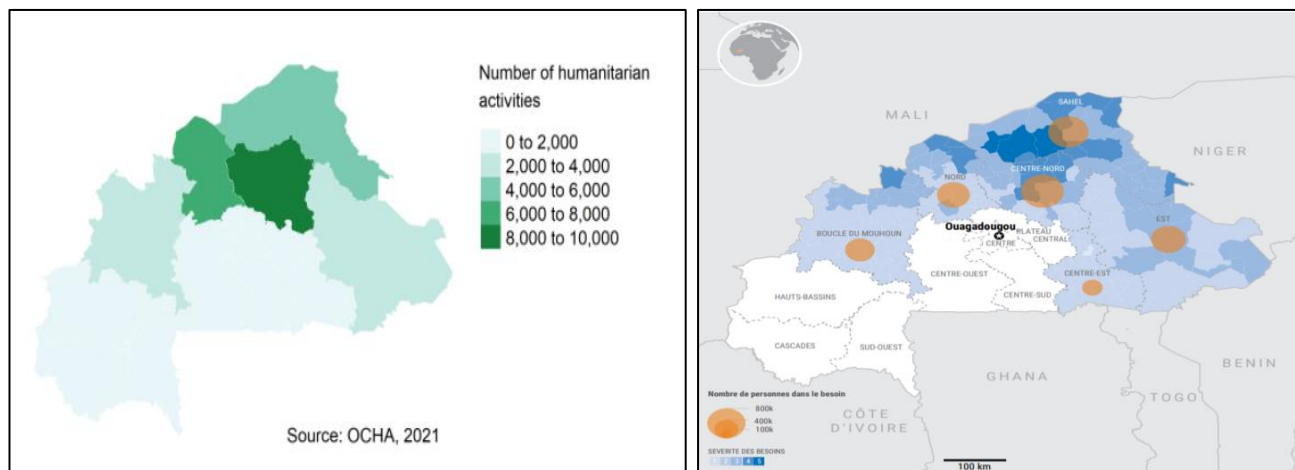

Source: OCHA, 2021

Chronologie de la crise

Le Burkina Faso a une seule saison des pluies. La saison des pluies s'étend de mai à octobre. Les préparatifs du terrain commencent généralement vers le mois de mars. Les semis peuvent avoir lieu dès mai et juin. La période de soudure maximale commence en juin et dure jusqu'en septembre. Alors que les cultures hâtives peuvent être récoltées en septembre. La récolte principale est généralement faite en novembre et décembre. La période sèche dure de novembre à avril.

Sur la base du calendrier saisonnier et des commentaires des partenaires, la période de juin, juillet, août et septembre est critique. C'est ce qu'on appelle communément la haute saison des pluies. Si les niveaux de précipitations suffisants ne sont pas atteints à ce moment, la saison est considérablement compromise. De plus, si la fin de la saison est également mauvaise, les impacts cumulatifs des faibles précipitations pendant cette période peuvent prolonger la période de soudure et d'autres besoins humanitaires peuvent commencer à se manifester.

En plus, le renouvellement des ressources en eau du pays est également dépendant de la pluviométrie et des nombreux points d'eau utilisés pour la consommation humaine et animale sont saisonniers. Pendant la saison des pluies, les ressources en eau souterraines superficielles se renouvellent par infiltration et les retenues d'eau superficielles (bolis, barrages) utilisés pour la production et distribution d'eau se remplissent. Pendant la période sèche, les ressources en eau diminuent jusqu'à atteindre leur niveau plus bas en mars-avril-mai ce qui correspond aussi à la période de plus grande chaleur et évaporation. Des nombreux points d'eau s'assèchent ou réduisent leur productivité. Ainsi, les besoins en eau sont les plus critiques en mars-avril-mai avec des risques de stress hydrique et tous les risques de protection associés aux conflits et tensions autour des rares points d'eau.

Dans ce contexte, deux moments clés du besoin humanitaire ont été identifiés par les partenaires pour orienter l'action d'anticipatoire. Ces moments, également appelés fenêtres d'opportunité, sont les suivants :

Fenêtre d'opportunité	Focus	Objectif	Durée de l'Action Anticipatoire
1	juin, juillet, août	Anticiper les impacts des précipitations inférieures à la moyenne pendant la période de mois de juin, juillet et août [saison des pluies de pointe] en déclenchant des actions dès le mois de mars.	mars – démarrage en décembre – fin
2	août, septembre, octobre	Anticiper les impacts des précipitations inférieures à la moyenne en août, septembre, et octobre [fin de saison] en déclenchant des actions dès le mois de juillet.	juillet – démarrage en avril – fin

L'illustration suivante montre l'évolution des besoins humanitaires tout au long du calendrier saisonnier, ainsi que le calendrier adéquat pour les interventions sectorielles, par secteur, selon les commentaires des partenaires.

Le calendrier de crise en dessous démontre le caractère progressif de l'aléa sécheresse car les impacts se suivent et se manifestent sur une durée de temps prolongé. Pour chaque type d'impact, le passage d'une couleur plus clair au foncé indique l'atteinte des conséquences humanitaires difficilement réversible. Ce qui veut dire que l'action d'anticipation doit avoir lieu sur le terrain avant ce changement.

Comme on peut voir, la sécheresse pourrait d'abord avoir des conséquences sur les principaux actifs de la population (production agricole, pastorale) ainsi que la recrudescence de certaines maladies humaines. Pour ensuite donner lieu à plusieurs conséquences socio-économiques et multisectorielles, fortement liées aux stratégies d'adaptation des ménages frappés par la sécheresse.

De façon synthétique, les principales conséquences pourraient être :

- **Production agricole** : l'impact sur les cultures se réalisera pendant des délais de temps différents dépendant du calendrier agricole et la typologie des cultures. Celles à être impactée immédiatement et de façon plus irréversible seraient les cultures pluviales, suivi par la production maraîchère et de contre-saison.

- **Elevage** : la faible régénération des pâturages et disponibilité des ressources hydriques peut avoir plusieurs conséquences. La soudure pastorale, au lieu de commencer en avril, pourrait s'anticiper aux mois de Février ou Mars, dépendant de l'envergure de la sécheresse. Cela impliquerait le besoin de fournir de l'assistance en intrants et soins vétérinaires avant cette période. La détérioration de la situation pastorale entraîne une perte de l'embonpoint des animaux et des morts massives du cheptel avec un risque élevé de trouble psychologique pour les pasteurs.
- **Sécurité alimentaire et nutrition** : la chute de la production agropastorale et des revenus peut déterminer une anticipation et prolongation de la soudure humaine l'année suivante à une année de sécheresse. Comme démontré dans le calendrier, au lieu de commencer en juin, la soudure humaine pourrait par contre avoir lieu déjà à partir de Mars, nécessitant donc la mise en place d'actions préventives plus tôt que prévu ;
- **Conséquences humanitaires** : plusieurs conséquences multisectorielles pourraient avoir lieu, liées à la chute des revenus et l'érosion des moyens d'existence, comme par exemple l'exode rural, les risques accrus de protection pour les couches vulnérables et l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Par exemple, la déscolarisation des enfants à cause de la transhumance et du faible revenu des parents, les déplacements, la vente des actifs productifs pour un déplacement anticipé vers une nouvelle zone sans abris, l'exposition des femmes et des filles aux risques de protection (animaux sauvage, banditisme etc.) liés soit au besoin de parcourir des distances plus grandes pour s'approvisionner en eau et bois de chauffe, mais aussi à des potentiels risques majeurs de pratiques d'adaptation négatives tels que la prostitution pour accéder à des revenus ;
- **La recrudescence de certaines maladies humaines**, liées soit à une augmentation due aux mauvaises conditions d'hygiène relatives à la sécheresse mais aussi à une plus faible accessibilité des soins de santé, à cause de la chute de revenus et une détérioration des conditions de santé générale de la population (sous-alimentation et malnutrition).

Le calendrier de crise démontre clairement que, dépendamment du type d'impact et des actions à entreprendre, la mise en œuvre des actions d'anticipation pourrait démarrer avant le début de la saison de pluie pour terminer au plus tard en février de l'année suivante, afin d'anticiper les impacts qui se produiraient plus tard.

Burkina Faso – Calendrier de la crise sécheresse																									
Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Climat	H					Saison de pluie					Saison seche						Saison de pluie								
Risque (Sécheresse)																									
Humanitarian Impact																									
Agricole : Cultures pluviales et fourragères				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Agricole:Cultures maraichères					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Elevage								x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Alimentaire				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Nutrition				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
WASH				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Protection				x	x	x	x	x	x	x	x	x													

X : Montre le temps d'intervention par secteur

Couleur : Montre un besoin humanitaires - en plus clair, indique un besoin moindre - en plus foncé : un besoin plus élevé.

3. Prévision et déclencheur

Aperçu

Un déclencheur d'action anticipatoire est basé sur un ensemble de critères pour aider à répondre à la question de savoir quand agir avant un choc. Il permet une prise de décision automatisée pour le décaissement rapide des fonds afin de soutenir les plans de l'action anticipatoire, lorsqu'un choc hors de l'ordinaire (ou grave) est susceptible de franchir le seuil préétabli pour la communauté ciblée exposée et vulnérable.

Le déclencheur de ce cadre se concentre exclusivement sur les précipitations. Plus précisément, le déclencheur se concentre sur les précipitations inférieures à la moyenne au cours des différentes périodes préoccupantes, à savoir : juin à août, et août à octobre. En raison des difficultés d'accès aux données locales pour la conception du déclencheur, le déclencheur a été conçu à l'aide de données publiées par l'Institut international de recherche de l'Université de Columbia (IRI). Pour cette même raison, le déclencheur utilise la prévision saisonnière publiée par l'IRI.

Le modèle utilise deux déclencheurs basés sur les prévisions, chacun axé sur les précipitations pendant les moments clés de la saison des pluies. Chaque déclencheur est évalué à un moment précis (pour vérifier s'il est atteint) et couvre l'une des deux périodes de préoccupation mentionnées ci-dessus :

- **Déclencheur I** : En mars, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne pendant la période de juin, juillet et août, des fonds sont débloqués pour le démarrage des activités par tous les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, la nutrition, la protection, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
- **Déclencheur II** : En juillet, si le déclencheur est atteint pour le risque de précipitations inférieures à la moyenne en août, septembre et octobre, des fonds sont débloqués pour la mise en œuvre d'activités par le secteur de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance.

Bien qu'étroitement liés, chaque déclencheur (I et II) est indépendant. En tant que tel, l'action anticipatoire des différents secteurs repose sur le respect du déclencheur respectif, et dans ce contexte, une activation partielle du plan d'action est possible.

Prévisions

Les prévisions à utiliser sont les prévisions saisonnières publiées par l'International Research Institute at Columbia University (IRI) à la mi-mars (pour la période juin-août) et à la mi-juillet (pour la période août-octobre). Voir : <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/>

Déclencheurs et seuils

Le seuil d'activation (ou déclencheur) est comme suit :

1. 40%, ou plus, de probabilité de précipitations inférieures à la moyenne, ET
2. La probabilité de précipitations inférieures à la moyenne devrait être supérieure de 5 pourcents à celle de précipitations supérieures à la moyenne.

Enfin, l'activation est également conditionnée à au moins 10 % de la zone (Boucle de Mouhoun, Centre-Nord, Sahel et Nord) répondant à ces critères. Ce critère vise à capter par la diffusion géographique un e-choc plus sévère, en phase avec les objectifs humanitaires du pilote. Dans l'ensemble, ce cadre vise à cibler 1 type de même¹.

Rôles et responsabilités dans la surveillance du déclencheur

Les deux déclencheurs seront surveillés par le Centre de données humanitaires (CHD) d'OCHA. Une fois le déclencheur atteint, soit en mars, en juillet, ou les deux, le CHD alertera l'équipe pilote par e-mail. Les moments clés de suivi incluent la mi-mars (pour la période juin-août) et la mi-juillet (pour la période août-octobre).

¹ En raison de données historiques très limitées (seulement depuis 2017), il est difficile de confirmer la période de retour du choc. Dans les bases de données historiques, et depuis 2017, le déclencheur n'a été atteint qu'une seule fois (soit 1 fois sur 4 ans) mais le choc pourrait être plus ou moins fréquent.

Protocole d'activation

La prédéfinition d'un protocole d'activation est essentielle pour éviter les retards lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint. Le protocole d'activation décrit les étapes spécifiques à suivre dès que l'un des déclencheurs est atteint.

Dès que le déclencheur est atteint, les actions suivantes seront entreprises :

- **Le Centre de données humanitaires (CHD)** informera le chef de bureau d'OCHA et l'équipe pilote d'OCHA (HFSA, CERF et OAD) par courrier électronique que le déclencheur a été atteint.
- **Le chef de l'OCHA informera le HC/CR** et fournira un e-mail préédigé pour informer les agences participantes. Le courriel précisera quel déclencheur a été atteint, quels secteurs sont activés, et quelles agences doivent prendre des mesures.
- **Le CH/CR informera le HCT et les agences participantes** (FAO, UNFPA, UNHCR, UNICEF et PAM).
- **L'unité de programme CERF finalisera les documents du projet.** Celui-ci utilisera les propositions de projets et les budgets pré-soumis par chacune des agences. Le CERF préparera également la déclaration stratégique de l'allocation, en veillant à ce que les propositions soient adaptées à l'événement déclencheur spécifique. Le bureau de pays d'OCHA assurera la liaison avec les agences concernées. Au besoin, HFSA apportera son soutien.
- **Le Secrétariat du CERF initiera le décaissement des fonds**, une fois les propositions de projet finalisées, permettant aux agences de démarrer leurs opérations.
- **Les agences mettront en œuvre dès que les lettres d'approbation du CERF seront envoyées.**
- **La surveillance du CHD se poursuivra** si l'activation a lieu en mars. Si le déclencheur de juillet est atteint, le CHD en informera le chef du bureau d'OCHA et l'équipe pilote, et relancera le processus d'activation ci-dessus.

4. Plan de l'Action Anticipatoire

Critère de sélection

Les actions anticipatoires visent à atténuer l'impact humanitaire de la sécheresse, interrompant ainsi les voies décrites dans la section chronologie de la crise ci-dessus.

Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

1. **Caractère anticipatif** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire du choc ?
2. **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de mener l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ?
3. **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses PA ont-ils la capacité institutionnelle (thématique, logistique, administrative, financière, ressources humaines) pour mettre en œuvre efficacement l'action compte tenu du délai et de l'échelle ?
4. **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées impacteront-elles positivement plutôt que négativement à la population ciblée ?

Propriétés des interventions

Les actions convenues au préalable se concentreront sur les objectifs fondamentaux suivants :

- **Atténuer les risques de protection** parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays, face à la sécheresse prévue, grâce à l'amélioration des systèmes et des capacités de surveillance des risques, le renforcement des systèmes de référence et des services connexes, des messages de sensibilisation, ainsi que la distribution de kits de dignité (UNICEF, UNFPA et UNHCR).
- **Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance** contre les risques de sécheresse pour les communautés agricoles et pastorales, en mettant l'accent sur les plus vulnérables, à travers la fourniture d'une assistance en espèces (conditionnelle et inconditionnelle), la création d'actifs, la livraison de messages clés, et la fourniture d'intrants et assistance technique aux agriculteurs et éleveurs (FAO et PAM).

- **Atténuer la mortalité liée à la malnutrition** aiguë grâce à un dépistage précoce et à des soins de qualité pour les enfants âgés de 6 à 59 mois (UNICEF).

Sommaire

Objectif du Cadre AA : Réduire l'impact de la sécheresse annoncée sur les individus et les communautés vulnérables et à risque dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun par une action anticipatoire collective et intersectorielle.

Résultat	Secteur	Agence	Activités proposées
Atténuer le risque de protection parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays, face à la sécheresse prévue.	Protection	UNFPA	• Fourniture de kits de dignité pour les femmes et les filles • Sensibilisation au risque et prévention VBG/PSEA
		UNHCR	• Renforcement du suivi de protection et du système de surveillance • Améliorer et mener la gestion des cas
		UNICEF	• Sensibilisation aux risques de protection de l'enfance et à la prévention • Renforcement des systèmes de suivi de la protection de l'enfance • Améliorer les systèmes de référence et de gestion des cas
Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre le risque de sécheresse	Sécurité alimentaire (aide alimentaire & Protection des Moyens d'existence	FAO	• Appui à l'agriculture pluviale (intrants, argent en espèce, appui technique/vulgarisation) • Soutien au bétail (argent en espèce, petit élevage et soutien vétérinaire) • Maraîchage (intrants, argent en espèce et soutien technique/vulgarisation) • Argent en espèce contre travail
		WFP	• Diffusion des alertes climatiques aux personnes vulnérables • Transferts monétaires conditionnels via la création d'actifs • Transferts monétaires inconditionnels via la protection sociale
Atténuer la mortalité liée à la malnutrition aiguë grâce à une détection précoce et des soins de qualité	Nutrition	UNICEF	• Renforcement du système de référence pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et de malnutrition aiguë modérée • Promotion des pratiques d'ANJE parmi les communautés ciblées • Supplémentation en micronutrition pour les enfants de 6 à 23 mois
Garantir l'accès à l'eau pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène	WASH	UNICEF	• Réhabilitation et construction de points d'eau • Formations communautaires sur la gestion de l'eau • Promotion de l'hygiène et distribution de kits d'hygiène

Pour un cadre logique détaillé, veuillez-vous référer à l'annexe 7.

Calendrier de mise en œuvre

Le calendrier de mise en œuvre est résumé ci-dessous.

Secteur	Agence	Déclenchement et décaissement des fonds	Délai de mise en œuvre	Durée
Protection	UNFPA	mi-mars	75+ jours	9 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	UNHCR			
	UNICEF			
Sécurité Alimentaire (Aide alimentaire & Moyens de subsistance)	FAO	mi-mars ET mi-juillet	75+ jours ET 30+ jours	9-12 mois débutant quand le déclencheur est atteint
	WFP			
Nutrition	UNICEF	mi-mars	75+ jours	9 mois débutant quand le déclencheur est atteint
WASH	UNICEF	mi-mars	75+ jours	9 mois débutant quand le déclencheur est atteint

Détails supplémentaires :

- Pour les périodes de mise en œuvre de 9 mois, les 6 premiers mois seront consacrés à la mise en œuvre des activités, et les 3 mois suivants, à la conclusion et au S&E.
- Pour la période de mise en œuvre de 12 mois, spécifique à la FAO et au PAM, les 9 premiers mois seront consacrés à la mise en œuvre des activités, et les 3 mois suivants, à la clôture et au S&E.

Ciblage

Les approches de ciblage à appliquer sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Géographie	Régions sélectionnées : Boucle de Mouhoun, Centre-Nord, Sahel, et Nord (au moins 10 % de la région doit remplir les critères de déclenchement) Cible géographique : Régions affectées par la sécheresse, Cadre Harmonisé (communes plus vulnérables) et accessibilité
Personnes affectées	Sécurité Alimentaire : ménages vulnérables des zones identifiées par le cadre harmonisé (FAO/PAM) et l'analyse de l'économie des ménages et registre des Personnes Déplacées Internes du Ministère en charge de l'Action Humanitaire (FAO), et registre de la protection sociale (PAM). WASH : l'UNICEF effectuera une évaluation rapide des besoins, en se concentrant sur les communautés (identifiées avec le Cadre Harmonisé) ayant des points d'eau non fonctionnels ou insuffisants pour faire face aux besoins. Protection : Le UNHCR, l'UNICEF, et le UNFPA cibleront les personnes déplacées, les femmes, les filles et les garçons par le biais des réseaux de protection existants (prestataires de services, chefs de communautés locales et autres acteurs locaux). Nutrition : L'UNICEF ciblera les enfants âgés de 6 à 59 mois, les femmes enceintes, et les mères allaitantes en établissant des systèmes de référence au sein des communautés vulnérables identifiées par le Cadre harmonisé.

Supplément	Clusters assurant la planification des activités afin d'éviter les chevauchements au niveau ICCG et sectoriel.
-------------------	--

Inscription des bénéficiaires et la portée

Les numéros de bénéficiaires et les pratiques d'enregistrement des différentes agences sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Secteur	Agence	Système d'enregistrement des bénéficiaires	Nbres estimés des bénéficiaires ²
Protection	UNFPA	Le système de suivi et d'orientation peut être utilisé pour identifier/suivre les bénéficiaires.	6.372
	UNHCR		400.000
	UNICEF		30.000
Sécurité alimentaire & Moyens d'existence	FAO	Enregistrement Kobo	36 400
	WFP	Enregistrement dans la plateforme SCOPE	35.000
Nutrition	UNICEF	Le système de suivi et d'orientation peut être utilisé pour identifier/suivre les bénéficiaires.	300.000
WASH	UNICEF	Enregistrement effectué dans les institutions/communautés et soumis par le biais de rapports réguliers par les PA	50.000

Inscription des bénéficiaires et la portée

En préparation de ce projet pilote, les agences ont soumis des documents de planification détaillés décrivant les principales considérations liées aux activités qu'elles proposent. Ces fiches d'intervention contiennent les informations suivantes :

- Une description des interventions anticipées, y compris les objectifs et les résultats attendus
- Un synopsis de la portée anticipatoire des activités
- Entrées dans le calendrier des activités, y compris des informations sur la fenêtre d'opportunité spécifique, le délai nécessaire pour fournir une assistance, et la durée de mise en œuvre idéale
- Contributions des agences sur la préparation aux opérations, y compris des informations sur la présence des opérations dans la zone ciblée, les dispositions en matière d'approvisionnement, les accords contractuels et les partenaires de mise en œuvre
- Budget détaillé des activités pour la fenêtre d'opportunité

Après approbation du cadre d'action anticipatif par le CR/HC et l'ERC, les contributions des fiches d'interventions sont utilisées pour développer le dossier de candidature du CERF, comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence, et des budgets spécifiques à l'agence. L'objectif est de compléter le plus possible le dossier CERF en amont de l'éventuelle candidature. Cela permet de minimiser le temps de latence entre l'activation du déclencheur et le début de l'action anticipatoire critique, dans le temps.

² Se rapporte aux individus et non aux ménages. Pour les estimations au niveau des ménages, divisez par 7, ce qui correspond à la taille moyenne des ménages. Veuillez noter qu'il s'agit d'une estimation de la portée potentielle. De plus, cela ne tient pas compte des bénéficiaires uniques. Les bénéficiaires peuvent accéder à différentes formules de soutien. Les chiffres réels des bénéficiaires seront connus lorsque l'action sera déclenchée.

L'état de préparation par agence dans chacun des secteurs est indiqué ci-dessous.

Secteur	Agence	Mesures de préparation
Protection	UNFPA	• La présence sur le terrain est confirmée dans la, ou les, zone(s) d'intervention • Dispositions contractuelles en place avec les PA • Analyse des données en place pour le ciblage (avec validation du gouvernement) • Des accords à long terme avec les sociétés commerciales pour la livraison des intrants et les accords de chaîne d'approvisionnement sont en place
	UNHCR	
	UNICEF	
Sécurité alimentaire & Moyens d'existence	FAO	
	WFP	
Nutrition	UNICEF	
WASH	UNICEF	

5. Financement pré-accordé

CERF

L'ERC a engagé jusqu'à 140 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies pour soutenir une série d'activités/actions anticipées. Au 4 octobre 2021, le CERF avait déboursé 63 millions de dollars pour des projets pilotes d'action anticipatoire au Bangladesh, en Éthiopie, en Somalie et au Népal.

Pour l'action pilote d'anticipation au Burkina Faso, l'ERC a engagé jusqu'à 15 millions de dollars du CERF pour une activation complète du cadre de lutte contre la sécheresse.

Les fonds du CERF seront débloqués sans regret une fois le déclencheur de l'action anticipatoire activé (voir Section 3). Si un déclencheur n'atteint pas son seuil convenu, le CERF ne versera pas de financement. Chaque composant déclencheur est évalué indépendamment. Le montant du financement des activités est clairement défini dans les propositions de projets et les budgets du CERF.

Tous les fonds seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF.

Le CERF décaisse les fonds une fois que trois conditions sont remplies :

- Approbation par le Coordonnateur Résident/Humanitaire du Cadre d'Action Anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets et des budgets spécifiques à chaque agence ; et
- Approbation par le Coordonnateur des secours d'urgence du cadre d'action anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation pré-convenue) ; et
- Activation du déclencheur pilote préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC.

6. Apprentissage

Aperçu

L'action anticipatoire collective reste un espace innovant. Ainsi, les pilotes facilités par OCHA investissent également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre étayé par un plan clair d'apprentissage, de suivi et d'évaluation. Chaque pilote est évalué pour déterminer si : 1) l'action humanitaire anticipatoire collective à grande échelle fonctionne et si l'approche anticipatoire conduit à une réponse ; 2) plus rapide ; 3) plus efficace (moins chère) ; et 4) plus digne.

L'apprentissage est organisé de manière relâchée le long de trois compartiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Surveillance de la livraison

S&E coordonné et spécifique à chaque agence pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus avec des questions et des indicateurs communs et coordonnés sur le calendrier, les résultats, la portée, et les défis.

Évaluation indépendante

Les évaluations indépendantes peuvent inclure : Une évaluation quantitative de l'impact de l'action anticipatoire sur le bien-être des ménages, à l'aide d'enquêtes auprès des ménages ; une évaluation qualitative pour évaluer l'expérience des bénéficiaires ; une évaluation des prévisions/déclencheurs pour évaluer les performances du modèle prédictif et identifier les moyens d'améliorer l'étalonnage et les performances du modèle.

Cadre logique commun

Chaque agence effectuera un suivi des activités sur la base d'un cadre logique préalablement convenu, permettant le partage et l'agrégation des données entre les agences/activités. Le suivi de la prestation de l'agence se concentrera sur les indicateurs de résultats, ainsi que de résultats préalablement convenus, et recueillera les données à ce sujet auprès d'un groupe de traitement et de comparaison établi lors de moments clés de la période de mise en œuvre, au moins une fois à la fin du cycle d'intervention. À cette fin, chaque agence a également nommé un point focal de S&E pour participer au groupe de S&E établi pour le pilote. En préparation ou pendant l'intervention, les agences recueilleront également les coordonnées des bénéficiaires et des groupes de comparaison, le cas échéant.

Les questions de haut niveau qui guident la surveillance de la livraison à travers les pilotes sont les suivantes :

- L'action d'anticipation a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment de l'intervention a-t-il eu une incidence sur l'impact des interventions sur le bien-être des ménages et la facilité de mise en œuvre ?
- Comparer les résultats des interventions d'anticipation avec des interventions similaires dans le passé qui se sont produites après la catastrophe.
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou de débordements ?

Sur la base de ces questions, les agences travaillant sur ce cadre se sont engagées à respecter le cadre logique commun de l'annexe 7, qui sera reflété dans l'allocation de chaque projet.

7. Annex

Cadre logique

Objectif Principal : Réduire l'impact de la sécheresse prévue sur les individus et les communautés vulnérables et à risque dans les régions du Nord, du Centre Nord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun à travers une action anticipatoire collective et intersectorielle

Objectif	Sécurité Alimentaire Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse		Nutrition Réduire la mortalité liée à la malnutrition aigüe par un dépistage précoce et une prise en charge de qualité des enfants de 6 à 59 mois	WASH Garantir une bonne hygiène et l'accès à l'eau pour la consommation/production	Protection Atténuer les risques de protection par l'assistance communautaire et individuelle aux femmes, filles et garçons déplacés internes et hôtes		
Agence	PAM	FAO	UNICEF	UNICEF	UNFPA	UNICEF	UNHCR
Résultats	Protège et promeut la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse	Prévenir les risques de sécheresse et réduire leur impact sur les personnes exposées	Renforcer la préparation à une réponse nutritionnelle d'urgence au Burkina Faso	Garantir l'accès des populations vulnérables à une eau propre et sûre pour la consommation Améliorer les pratiques d'hygiène des populations vulnérables dans les zones affectées	Atténuation des risques et réponses multisectorielles aux violences basées sur le genre liées aux effets de la sécheresse	Protéger les enfants contre les violences liées aux effets de la sécheresse	L'accès au territoire est garanti pour les personnes sous mandat du HCR ayant des besoins de protection La prévention des groupes à risque y compris les enfants et les personnes handicapées est réalisée
Sortir des données (Outputs)	Dispositions préventives pour minimiser les effets du risque de sécheresse dans les populations plus vulnérables	Les moyens d'existence agricoles de ménages ruraux exposés aux risques et conséquences négatives de la sécheresse (personnes déplacées et communautés d'accueil) sont protégés et renforcés Les moyens d'existence pastoraux de ménages ruraux exposés aux conséquences négatives de sécheresse (personnes	Les plateformes communautaires ont les capacités requises pour le dépistage et le référencement des enfants malnutris vers les services adaptés La promotion des pratiques optimales d'ANJE est faite vers femmes et adolescentes enceintes et allaitantes à travers groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'ANJE (GASPA)	Proportion de communautés ciblées dans les districts sélectionnés abandonnant les mécanismes d'adaptation négatifs (c'est-à-dire allant chercher l'eau à des sources non protégées ou points d'eau trop éloignés des exposés à des risques accrus de protection).	Les risques des violences basées sur le genre dans le contexte de la sécheresse sont atténués	Violences liées aux effets de la sécheresse et prévenues, compris le renforcement d'un système d'identification et de référencement des enfants dans les besoins de protection	Le monitoring contribue à une amélioration de l'environnement de protection Appui aux environnements plus sûrs et atténuation des risques de violences basées sur le genre (VBG)

		déplacées et communautés d'accueil) sont protégés et renforcés	Les approches simplifiées sont mises en œuvre pour assurer la continuité des services de PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe)	Proportion de communautés ciblées pratiquant des normes d'hygiène correctes			
Activités	Mars : 1. Fournir des services climatiques basé sur les systèmes existants 2. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires conditionnels Juillet : 3. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires conditionnels 4. Apporter une assistance alimentaire via des transferts monétaires inconditionnels	Mars : 1. Distribution de cash + intrants de cultures vivrières pluviales (semences à variétés précoces et résistantes à la sécheresse + autres intrants) au profit de 2500 ménages vulnérables ; 2. Distribution de cash + intrants de cultures maraichères de saison sèche au profit de 1500 ménages vulnérables en vue d'atténuer les conséquences de la sécheresse ; 3. Réalisation de travail contre espèce par 2000 ménages vulnérables pour la réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques et d'ouvrages de CES/DRS en vue de la production agricole. Juillet : 4. Fourniture de soins vétérinaires, d'aliment bétail et de cash + au profit du cheptel de 2000 ménages vulnérables à l'effet de mitiger l'impact de la sécheresse sur les moyens d'existence ;	Mars : 1. Intégration systématique de la formation des mères membres des GASPA sur la mesure du Périmètre Brachial (PB mère) et équipement en mètre ruban (Bande de Shakir) pour leur implication dans le dépistage précoce de la malnutrition aigüe chez leurs propres enfants. 2. Renforcement du système de référence et contre référence des enfants Malnutris Aigüe Sévère (MAS) et Malnutrition Aigüe Modérée entre le niveau communautaire et les formations sanitaires, 3. Pour la population hôte et les PDI résidant dans la communauté hôte : prévention de la malnutrition à travers la promotion des pratiques d'ANJE dans la communauté (GASPA : Groupe d'Apprentissage et de Suivi de Pratiques d'ANJE), la supplémentation en micro-nutriments (Vitamine A, et déparasitage) des enfants de 6-23 mois),	Mars : 5. La réhabilitation des points d'eau non fonctionnel, 6. L'installation de Poste d'eau autonome sur des forages à grand débit existant en vue d'optimiser les ressources, 7. Le renforcement des capacités des communautés dans la gestion préventive des ouvrages, 8. La distribution de kits d'hygiène pour le stockage et le transport de l'eau et le lavage des mains et 9. La promotion à l'hygiène pour la réduction des maladies hydriques dont les épidémies.	Mars : 1. 1. Distribuer 2000 kits de dignités 2. Sensibiliser 4200 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) sur la VBG pour la transmission des messages sur les services disponibles pendant la période de la sécheresse ; 3. Organiser des groupes de paroles avec 2400 femmes et filles pour discuter des mesures d'atténuation des risques de VBG dans le contexte de la sécheresse	Mars : 1. Elaborer et diffuser des messages de sensibilisation communautaires sur la prévention de séparation et des violences y compris les VBG/SEA 2. Renforcer mécanismes communautaires de protection de l'enfant pour une prévention efficace 3. Identifier les services sociaux et communautaires de base pour développer un système d'identification et de référencement et de prise en charge des enfants affectés par les effets de la sécheresse	Mars : 1. Mise en place des comités de protection et appui à la tenue des sessions 2. Identification des personnes à besoins spécifiques (PBS) 3. Assistance matérielle aux cas identifiés parmi les PBS 4. Renforcement des mécanismes d'engagement communautaire 5. Amélioration des mécanismes de référencement 6. Faciliter un accès sécurisé aux combustibles et à l'énergie, aux femmes et filles, afin de réduire les risques liés à la collecte de bois de chauffe

		5. Distribution d'animaux à cycle court (lapins, volailles, caprins) et de cash (modalité cash +) à 1000 ménages vulnérables exposés à la sécheresse pour renforcer et diversifier leurs moyens d'existence	4. Renforcement du système de santé à travers la formation de personnels de santé sur la mise en œuvre des approches simplifiées (dépistage et prise en charge sur les sites avancés), la dotation en outils de travail et l'appui technique pour la coordination de la nutrition dans les régions et les districts concernés.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Indicateurs

Indicateurs des résultats	Sécurité Alimentaire Protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance contre les risques de sécheresse		Nutrition Réduire la mortalité liée à la malnutrition aiguë par un dépistage précoce et une prise en charge de qualité des enfants de 6 à 59 mois	WASH Garantir une bonne hygiène et l'accès à l'eau pour la consommation / production	Protection Atténuer les risques de protection par l'assistance communautaire et individuelle aux femmes, filles et garçons déplacés internes et hôtes		
	PAM	FAO	UNICEF	UNICEF	UNFPA	UNICEF	UNHCR
	Nombre de personnes vulnérables stabilise et protéger vis-à-vis l'impact de la sécheresse	Au moins 50% des agriculteurs de culture pluviale et 70% des agriculteurs de cultures maraichères, appuyés par le projet, ont eu une production égale ou supérieure à la moyenne des derniers trois/5 ans. La production agricole moyenne des bénéficiaires des appuis de la FAO est de 10% supérieure à celle des agriculteurs de l'échantillon contrôle (agriculteurs avec profil socio-économique similaire et également affecté par la sécheresse, mais n'ayant pas reçu de soutien) Au moins les 60% des pasteurs soutenus par le projet n'ont pas perdu	Nombre de personnes bénéficiant d'une alimentation complémentaire ciblée. Nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë modérée inscrites à un programme d'alimentation complémentaire.	Pourcentage de personnes utilisant de l'eau en quantité suffisante et salubre ; pour boire, cuisiner, et pour l'hygiène personnelle Pourcentage de personnes démontrant des pratiques d'hygiène sûres ayant reçu une promotion de l'hygiène et/ou une distribution d'articles/matériels d'hygiène	Nombre de mécanisme communautaire de protection des violences basées sur le genre renforcés pour prévenir les effets de la sécheresse	Nombre de mécanisme communautaire de protection de l'enfant renforcés pour prévenir les effets de la sécheresse	Nombre de cas de protection identifiés % de cas identifiés ayant reçu une assistance % de cas identifiés et référencés ayant reçu une assistance Nombre de cas de VBG rapportés

		plus de 15% de leur cheptel ; La production de lait moyenne du cheptel des bénéficiaires des appuis du projet est de 30% supérieure à celle des pasteurs de l'échantillon contrôle (pasteurs avec profil socio-économique similaire et également affecté par la sécheresse, mais n'ayant pas reçu de soutien) L'évaluation ROI (Return on Investment – couts bénéfices) indique que pour chaque dollar investi dans la sauvegarde de la production agricole, cela a généré plus de 2 dollars de bénéfices économiques pour les bénéficiaires du projet					
Indicateurs des activités	Nombre de personnes bénéficiant de transferts monétaires inconditionnels spécifiques au secteur. Valeur totale des transferts monétaires inconditionnels spécifiques au secteur, distribués en USD. Nombre de personnes bénéficiant de transferts monétaires conditionnels. Valeur totale des transferts monétaires	Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis en intrants de cultures pluviales Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis en intrants de cultures maraichères Nombre de ménages ayant bénéficié de Cash for work Nombre de ménages ayant bénéficié d'appuis soins vétérinaires et	Pourcentage de personnes admises pour un traitement MAM, et qui se sont rétablies. Nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë sévère admises dans un programme d'alimentation thérapeutique. Pourcentage de personnes admises pour un traitement MAS, et qui se sont rétablies. Nombre de personnes dépistées pour malnutrition aiguë.	Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant un accès durable à au moins 15 l/j/p d'eau aux normes de qualité standards Nombre d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable réhabilitées ou construites Nombre d'abreuvoirs aménagés pour petits ruminants Nombre d'artisans réparateurs, AUE	Nombre de femmes et de filles bénéficiant de kits de gestion de l'hygiène menstruelle et/ou de kits dignité Nombre de communautés (PDI et non PDI) touchées par les messages qui sauvent les vies	Nombre de personnes, y compris les enfants (filles et garçons), les femmes et les hommes sensibilisées sur la protection et prévention des enfants aux effets de la sécheresse Nombre d'enfant affectés par les effets de la sécheresse qui sont identifiés et référés par les structures communautaires de protection de l'enfant vers les services sociaux de prise en charge	Nombre de personnes bénéficiant des services de base en matière de VBG (ex : gestion de cas, soutien psychosocial, gestion clinique du viol, PPE, etc....) Nombre des missions de suivi de la protection menées éclairant la réponse humanitaire. Nombre de mises à jour/rapports de la matrice de suivi des déplacements.

	conditionnels distribués en USD.	aliments bétail pour protéger leur cheptel	Nombre de personnes recevant des suppléments de vitamines et/ou de micronutriments.	formés et/ou redynamisés			Nombre de voies de référence établies et régulièrement mises à jour.
	Nombre de personnes informées des risques associés à la sécheresse.	Nombre de ménages ayant bénéficié de noyaux d'élevage à cycle court	Nombre de personnes bénéficiant de formations et/ou de sessions de sensibilisation communautaire sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d'urgence.	Nombre de personnes désagrégés par sexe et âge ayant bénéficié des activités de promotion à l'hygiène et mobilisation communautaire			Nombre de personnes bénéficiant de parcours de référence.
				Nombre de ménages ayant reçu un kit d'hygiène pour le stockage et le transport de l'eau et le lavage des mains			Nombre de mécanismes de protection communautaire mis en place pour identifier, prévenir, atténuer et, répondre aux violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme.

Plan d'action par secteur

Food Security and Livelihoods

Mise en œuvre Actions Anticipatoires (AA)																							
Ciblage lié à l'agriculture/alimentaire																							
Déclenchement en mars				\$																Legend			
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J			
FAO	Préparation opérationnelle Interne																						
	1. Distribution de variétés de semences pluviales à cycle court/à maturation rapide, et une aide en transferts monétaires																				\$	Financement	
	Démarrage																						Temps préparation des opérations
	Distribution Intrants et Cash																						Etapes de mise en œuvre
	Suivi - Encadrement technique des bénéficiaires																						Etapes évaluation et leçons apprises
	2. Distribution de variétés de semences maraichères et une aide en transferts monétaires																						
	Démarrage et finalisation aspects opérationnels																						
	Distribution Intrants et Cash																						
	Suivi - Encadrement technique des bénéficiaires																						
	3. Réalisation de travaux de Cash for work pour la réhabilitation des sites maraichers, des ouvrages hydrauliques et d'ouvrages de CES/DRS en vue de la production agricole.																						
	Démarrage																						
	Distribution Cash et travaux - Suivi et encadrement technique																						
	4. Suivi/Evaluation - ROI et leçons apprises																						
	Enquête Baseline																						
	Collecte des données ROI AA1																						
	Collecte des données ROI AA2																						
	Analyse des données																						
	Rapport et Atelier Leçons apprises																						
WFP	Préparation opérationnelle Interne																						
	Fournir les services climatiques basés sur les systèmes existants																						

[illegible]

Nutrition

Mise en œuvre Actions Anticipation (AA)																									
Ciblage lié à l'agriculture/alimentaire																									
UNICEF NUTRITION	Declenchement en Mars				\$																	Legend			
	Preparation opérationnelle Interne																								
	Formation des personnels équipe cadre des districts et des personnels de santé et ASBC sur l'approche PB- à domicile.																								
	Formation des mères membres des GASPA sur l'approche PB mère.																								
	Acquisition et dotation aux mères de ruban PB (bande de Shakir)																								
	Reproduction des cartes de référencement																								
	Dépistage et référence des enfants au cours des sessions de GASPA																								
	Mise en place des GASPA et animations mensuelles des sessions de promotion sur les thématiques ANJE, stimulation et éveil du jeune enfant																								
	Reproduction des matériels de communication et de gestion des activités ANJE																								
	Formation des personnels équipe cadre des districts et des personnels de santé et ASBC sur la mise en œuvre des approches simplifiées de prise en charge de la malnutrition.																								
	Dotation des ASBC en matériels anthropométrique et en outils de gestion																								
	Prise en charge des enfants malnutris																								
	Supervision reporting																								

WASH

Mise en œuvre Actions Anticipatoire (AA)																						
Ciblage lié à l'agriculture/alimentaire																						
Déclenchement en mars						\$																Légende
UNICEF	Préparation opérationnelle Interne																					
	1. Réhabilitation de 20 points d’eau non fonctionnels																					
	2. Installation de 12 postes d’eau autonomes sur les forages à grand débit identifiés pour la consommation et la production (abreuvoir de 5 m³ pour petite bétails)																					
	3. Le renforcement des capacités des communautés dans la gestion préventive des ouvrages																					
	4. La distribution de 6.000 kits d'hygiène																					
	5. La promotion à l'hygiène pour la réduction des maladies hydriques dont les épidémies																					

Protection

Mise en œuvre Actions Anticipation (AA)																							
Ciblage lié à l'agriculture/alimentaire																							
Déclenchement en mars					\$																	Légende	
UNHCR	Préparation opérationnelle Interne																						
	1. Mettre en place ou renforcer (en fonction des zones partiellement couvertes ou non-couvertes) le suivi de protection/système de surveillance actuel (moniteurs, informateurs clés et réseaux de points focaux communautaires).																						
	2. Répondre aux situations à risques (tensions et cas de protection) identifiées par le suivi de protection ajusté de manière continue																						
UNFPA	Préparation opérationnelle Interne																						
	Distribution des kits de dignités																						

	Faciliter le référencement des cas de VBG auprès des services de prise en charge																			
	Disséminer les messages de sensibilisation communautaires sur la VBG, les services disponibles, et la mitigation des risques de VBG, y compris l'EAS.																			
UNICEF	Préparation opérationnelle Interne																			
	Elaborer et diffuser les messages de sensibilisation communautaires sur la prévention de séparation et des violences, y compris les VBG/SEA a l'endroit de 30.000 personnes, y compris les enfants, suite aux effets de la sécheresse																			
	Renforcer 50 mécanismes communautaires de protection de l'enfant pour une prévention efficace contre les effets de la sécheresse																			
	Identifier les services sociaux et communautaires de base pour développer un système d'identification et de référencement et de prise en charge de 500 enfants affectés par les effets de la sécheresse																			

Analyse des risques de référence

Analyse des risques de référence pour le Burkina Faso, accessible ici: https://ocha-dap.github.io/pa-anticipatory-action/analyses/bfa/docs/bfa_risk_overview.html

Equipe pilote

Composition de l'équipe pilote au Burkina Faso :

Secteurs	Agences	Noms et Titres	Contacts
Protection	UNFPA	Edith Ouedraogo Dalomi Bahan	eouedraogo@unfpa.org bahan@unfpa.org
	UNHCR	Serge ATSOMAUTSY – Senior Protection Officer Ignace MBOM – Programme Monitoring Officer	atsomaut@unhcr.org mbom@unhcr.org ellias@unhcr.org
	UNICEF	Bilal SOUGOU (Responsable programmation) Issa KONE (Responsable M&E)	bsougou@unicef.org ikone@unicef.org
Sécurité Alimentaire	FAO	Mamoudou TAMBOURA (Point focal technique) Adama DIAKITÉ (Suivi-évaluation)	Mamoudou.Tamboura@fao.org adama.diakite@fao.org
	WFP	Faroukou GARBA Jonas SOUBEIGA	faroukou.garba@wfp.org jonas.soubeiga@wfp.org
Nutrition	UNICEF	Médiatrice KIBURENTE (Point focal technique) Ousmane OUEDRAOGO (Point focal suivi-évaluation)	mkiburente@unicef.org
WASH	UNICEF	Ahmedou Behah, UNICEF Chief WASH section Jean Paul Ouedraogo, WASH spécialiste Moussa Sankara, Monitoring & Evaluation Officer	abehah@unicef.org jpouedraogo@unicef.org msankara@unicef.org
OCHA		Kristen KNUTSON, Head of Office Marina THRONE-HOLST, Head of Coordination Andre ARRIAZA, Humanitarian Affairs Officer CERF Josée POIRIER, Data Scientist, CHD	knutson@un.org throne-holst@un.org andre.arriaza@un.org josee.poirier@un.org
